



شهرداری
قزوین
(کد: ۱۲۸۵)

شهرداری مرکز

شماره:

۱۳۹۸/۱۲/۲۶

تاریخ:

پیوست:

شرايط مناقصه عمومي

(يك نوبته - يك مرحله)

شهرداري قزوين درنظر دارد پروژه احداث پارک مسافر را از محل اعتبارات داخلی شهرداري قزوين به شماره و ديف بودجه ۳۵۰۹-۸ (توسعه بوسنان ملي براجين) و بر مبنای آئين نامه معاملات شهرداري تهران با هرايط زير واگذار نماید. شركت كنندگان بایستى جهت شركت در مناقصه موارد ذيل را دقیقاً مراعات نمایند:

- ۱- کارفرماه شهرداري قزوين
 - ۲- دستگاه فظارت: منطقه نمونه گردشگري براجين قزوين
 - ۳- دستگاه مناقصه گزاره شهرداري قزوين.
 - ۴- مدت اجرائي کار: مدت اجرائي کار از زمان ابلاغ قرارداد به مدت ۴ ماه (چهار ساه) کامل شعسي مي باشد.
 - ۵- موضوع مناقصه: بروژه عمليات احداث پارک مسافر، مطابق با نقشهها و مشخصات فني خصوصي و عمومي و سایر مدارك و ملحقات پيوست
 - ۶- پايه شركت پيشنهاد دهنده: پيشنهاد دهنده مي بایست داراي حداقل پايه ۵ و شتءه اينه باشد.
 - ۷- محل اجرائي کار: قزوين، منطقه نمونه گردشگري براجين.
 - ۸- مبلغ برآورد اوپرها: ۴۵۵/۹۹۸/۸/۲۱۷/۴۵۵ ریال (هشت ميليارد و دوبيست و هفده ميليون و چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهمصد و نواد شتن ریال)
 - ۹- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ميزان ۴۱۱/۰۰۰ ریال (چهار صد و يازده ميليون ریال) است که باید به يكى از روشهاي مشروحة زير، در پايك "الف" به دستگاه مناقصه گزار و تسلیم شود.
- الف- رسيد بانکي واريز وجه مذبور به حساب شماره: ۱۳۶۵۶۰۶/۰/۱۰ به نام شهرداري قزوين، نزد بانک رسالت قزوين.
- ب- ضمانت نامه بانکي بنفع کارفرما.
- مدت اعتبار تضمين فوق باید حداقل سه ساه (۳ ساه) پس از تاریخ افتتاح پيشنهادها بوده و علاوه بر آن ضمانتنامه بانکي تيز بایستى طبق فرمهاي مورد قبول دستگاه مناقصه گزار و آز بانک مورد ئاييد کارفرما تهيه و تسلیم گردند.





شهرداری قزوین
(آگس ۱۴۸۶)

شهرداری مرکز

۱۰/۱۳۹۸/۴۱۷۶۲

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

مکان:

بازدید

۱۰- استناد مناقصه تا ساعت ۱۶ روز ۵ و تاریخ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ از طریق سایت شهرداری قزوین (qazvin.ir) و یا از طریق هرجامعه حضوری قابل دسترسی و برداشت می باشد.

۱۱- نشانی محل اخذ استناد مناقصه سایت شهرداری قزوین (qazvin.ir) یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی شهرداری مرکزی قزوین است. حزینه دریافت حضوری استناد مناقصه ۱۰۰۰/۱/۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد که با ارائه اصل رسیدگی پیمان و ارزی مذکور به حساب شماره ۷۰۰۶۰۰۴۱۶۵ نوب بانک شهر بنیعه فلسطین قزوین صورت می پذیرد.

۱۲- به این مناقصه به هیچ وجه مابه التفاوت تعلق نمی گیرد.

۱۳- مبنای محاسبه تعديل سه عاشه چهارم سال ۱۳۹۸ سو باشد و محاسبه تعديل در این پیروزه بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۱۱۱۲۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ صورت می پذیرد.

تعصیر ۱: کارفرما می تواند قسمی از مطالبات بیسانکار را به صورت غیر نقدي و از دارایی واگذاری املاک با رعایت قوانین و عقرات و تشریفات لازمه شهرداری انجام دهد.

۱۴- پیشنهادات باید جداگانه تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ درسه پاکت جداگانه (الف و ب و ج) لاک و مهر شده در قبال اخذ رسیدگی به دبیرخانه شهرداری مرکز قزوین تحويل شود.

پاکت الف محتوى ضمانت نامه بانکی و یا رسیدگی واریز نماید به میران شخص در بند ۱۰ می باشد.

تعصیر ۲: کمیسیون به پیشنهادات فاقد سپرده معتبر و کمتر از میران سندراج در بند ۱۰ ترتیب اثر نخواهد داد و پاکت "ج" آن باز گشایی می شود.

پاکتها می بایست محتوى کلیه استناد مناقصه و مدارکه ذیل باشند:

- کلیه استناد مناقصه، دستورالعمل و مشخصات کنی مناقصه و استناد و مدارک بیمان (دریافتی از کارفرما) و کلیه مکتوباتی که توسط مناقصه گزار برای شرکت کنندگان در مناقصه ارسال شده است، که به مهر و امضای صاحبان اعضاء شرکت رسیده باشد بدون تغییر یا حذف و دخل و تصرف در استناد فوق و در صورتیکه یک یا چند قسمت از استناد مناقصه به مهر و امضاء شرکت نرسیده باشد؛ تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمامی شرایط استناد مناقصه از سوی پیشنهاد دهنده خواهد بود و چنانچه استناد ارائه شده



١٣٦

شہرداری مرکز

فاقد مهر و امضای پیشنهاد دهنده باشد؛ پیشنهاد ارائه شده مردود تلقی می‌گردد و پاکت پیشنهاد قبضت قابل بازگشایی نمیراشد.

- تکمیل و ارائه فرم خود اظهاری اعلان کارهای در دست اجرا، و ظرفیت آماده بکار با مهر و امضای شرکت به انضمام چک لیست استاد مناقصه که تماماً کنترل و تایید و به مهر و امضای شرکت رسیده باشد.
 - تصویر تمام صفحات اساسنامه شرکت به همراه مهر و امضای شرکت.
 - تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه و سمعی به همراه مهر و امضای شرکت.
 - تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه و سمعی به همراه مهر و امضای شرکت.
 - ارائه برگ مشخصات سهامداران که به اعضاء شرکت رسیده باشد.
 - تصویر گواهی تشخیص صلاحیت، رتبه و رشته، دارای اعتبار از سازمان مدیریت و برنامه دیزی کشور.
 - ارائه فرم خود اظهاری در خصوص پروژه‌های در دست اجرا که تحويل موقع قشده باشند به انضمام اعلان پیش‌رفت ریالی و قیزیکی آنها و در صورت وجود مستنداتی دال بر عدم رضایت مناقصه گزار از شرکت کننده در مناقصه در طی سنتوات قبل، مدارک دریافتی وی در کمیسیون مناقصه مقتوج تعیشون و شرکت کننده حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 - تصویر گواهینامه تایید صلاحیت اینمی دارای اعتبار از اداره کار و امور اجتماعی
 - تصویر برابر اصل گواهی تطبیق امضاء دارندگان حق امضاء شرکت از دفاتر استاد رسمنی همراه با مهر بر جسته.
 - تصویر اصل شناسنامه و کارت ملی و ... مدیر عامل و دارندگان حق اعضاء شرکت.
 - ارائه فرم آدرس پستی قانونی شرکت بعلاوه خطوط تماس که به مهر و امضای شرکت رسیده باشد.
 - ارائه برگ تهدید ثامه پیشنهاد دهنده بر مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی به همراه مهر و امضای شرکت.
 - تصویر برابر اصل وکالت نامه (در صورت وجود) از دفاتر استاد رسمنی همراه با مهر بر جسته.
 - ارائه استاد مینم، بر دارا بودن کار مشابه در ۵ سال اخیر. (سوابق کاری و مدت فعلیت)

باکت جه محتوی پیشنهاد قیمت داوطلب انجام کار که منضم به جداول بخشاندهای ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۷ و ۹۶/۱۲۳۴۵۷۹ عورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور، باید طبق نمونه در بافتی از شهرداری با عدد و حروف خوانا و بدون ایهام نوشته شده و به امضا و مهر پیشنهاد دهنده رسیده باشد و لاک و مهر شده تحویل دبیر خانه مرکزی شهرداری قزوین شود.



تبصره ۱۳: کمیسیون به پیشنهادات عبیه، مشروط، مخدوش، فاقد سهرده، رزومه مرتبط و مدارک مورد نیاز در اسناد مناقصه، همچنین فرم تکمیل شده جداول پخشندامه های ارائه پیشنهاد قیمت و با آنها که بعد از وقت مقرر بررسد ترتیب اثر نخواهد داد.

تبصره ۱۴: در روی پاکات فوق الذکر باید موضوع مناقصه، شماره و تاریخ اسناد مناقصه، تام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسليم پیشنهاد نوشته شود و در عهله مقرر (با اخذ رسید حاوی ساخت و تاریخ وصول)، به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد. شرکت کننده در مناقصه پس از تسليم پیشنهاد خود مجاز به تغییر و یا اصلاح آن نخواهد بود. مگر دو شرایط موضوع بندهای ۱۷ و ۱۶ این فرم.

تبصره ۱۵: پیشنهاد دهنده مکلف به ارائه ضریب پیشنهادی در قالب فرمهای الف تا ب پراساس دستورالعمل ۱۳۸۷/۸/۱۹ مورخ ۱۰۰/۷۹۵۷۴ نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از مسوی پیمانکاران به تفکیک فصلهای فهرست بیها، ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و در صورت عدم ارائه فرم های مربوطه، پیشنهاد قیمت شرکت کننده در مناقصه مردود می باشد.

تبصره ۱۶: پیشنهاد دهنده مکلف به ارائه آنالیز قیمت پیشنهادی مطابق با فرمهای ۱ تا ۶ بر اساس دستورالعمل ۱۳۹۶/۱۲/۲۵۷۹ مورخ ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ نحوه ارائه تجزیه بهاء همراه با پیشنهاد فیعست توسط پیمانکاران، ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و در صورت عدم ارائه فرم های مربوطه، پیشنهاد قیمت شرکت کننده در مناقصه مردود می باشد.

تبصره ۱۷: پیشنهاد دهنده می باشد از محل احداث بروزه واقع در قزوین، بستان ملی ساراجیون؛ پارک مسافر بازدید بعمل آورده و سپس مباردت به ارائه پیشنهاد قیمت نماید. بدینهی است پس از ارائه پیشنهاد، هیچگونه ادعایی مبنی بر عدم اطلاع از شرایط بروزه قابل قبول نخواهد بود.

-۱۵ مناقصه گزار حق تغییر، اصلاح و یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسليم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابلاغ می شود و در صورتیکه پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مذبور تسليم شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را پذماید.

-۱۶ از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تعمیم مقادیر با قیمتها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاد



شهرداری مرکز

دهندگان به تعویق اندازد بد نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

- ۱۷ میرزان تضمین انجام تعهدات برابر ۵ درصد مبلغ پیشنهادی می‌باشد که قبل از انعقاد قرارداد و به صورت ضمانتنامه بالکنی از برندۀ مناقصه اخذ می‌گردد.
- ۱۸ از مبلغ هر پرداخت بد پیمانکار معادل ۱۰٪ به عنوان تضمین حسن انجام گذارد و در حساب سپرده، نزد کارفرما نگهداری می‌شود، نیمی از این مبلغ، یعنی از تصویب صورت وضعیت قطاعی طبق ماده ۴۰ و نیمی دیگر پس از تحويل قطعی برمبنای دوره تضمین با واعیت ماده ۴۲ و ۵۲ شرایط عمومی بیان مسترد می‌گردد.
- ۱۹ تمام استاد مناقصه از جمله این فرم باید به مهر و امضا مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با استاد پیشنهاد قیمت تسلیم شود.
- ۲۰ به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تسلیم می‌شوند ترتیب افراده نخواهد شد.
- ۲۱ پیشنهادهای واصله در ساعت ۹ روز دوستبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۵ در کمیسیون عالی مناقصه واقع در شهرداری مرکزی قزوین باز و حوالده می‌شود، حضور یک نفر نهاینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در صورت ارائه معرفی نامه، در جلسه افتتاح پیشنهادها نلاهانیج است.
- ۲۲ برندهای اول و دوم مناقصه بر اساس آئین فاعله معاملات شهرداری تهران تعیین می‌شوند.
- ۲۳ شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها اختیار است، در اعن صورت سپرده‌ها استرد خواهد شد.
- ۲۴ سپرده برنده اول و دوم نا انعقد قرارداد با برنده اول مسترد نخواهد شد و چنانچه برنده اول از تاریخ ابلاغ حداقل به مدت یک هفته از مضا قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و در صورت ابلاغ شهرداری چنانچه برنده دوم نیز حاضر به بستن قرارداد نشود سپرده او نزد به نفع شهرداری ضبط می‌گردد.



شہر داری مرکز

نحوه **۵** رجوع به پیشنهاد دهنده که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد، به شرطی مبسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برندۀ مناقصه از مبلغ سپرده پیشتو نباشد در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است.

- ۲۵- شهرداری اختیار دارد مقدار عملیات اجرایی موضوع قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد کل مورد معامله افزایش و یا کاهش دهد.

-۲۶- هرگونه توضیح یا تجدید نظر با حذف و اضافه نمودن استناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها، کتاب آز سوی دستگاه مناقصه گزار اعلام و جزو استناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.

-۲۷- کسور قانونی که قانوناً بابت معامله به طرف قرارداد تعلق می‌گیرد در موقع پرداخت مطالبات او کسر می‌گردد و به عهده پیمانکاری باشد.

-۲۸- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به متزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری قزوین می‌باشد.

-۲۹- شهرداری الزامی به پرداخت، پیش پرداخت ندارد و در صورت پرداخت (به میزان ۲۰ درصد)، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن در این پیمان طبق مصوبه شماره ۱۱۳۴۰۲ ت ۵۰۶۵۹ ه ۱۳۹۴۰۹/۲۲ هیأت محترم وزیران می‌باشد.

-۳۰- آین نامه معاملات شهرداری تهران و کلیه العاقات و اصلاحات منصوب به آن و شرایط عمومی پیمان حاکم بر این مناقصه و قرارداد آن آن می‌باشد.

-۳۱- پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موكول به تایید صورت وضعیت کارگرد توسط دستگاه نظارت پس از کسر کسور قانونی انجام می‌گیرد.

-۳۲- هرگاه در جریان مناقصه، اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهنده‌گانی به زیان مناقصه گزار یا منافع جمهوری اسلامی ایران با هم تبانی و با مصالحه کرده‌اند، مناقصه لغو خواهد شد و مناقصه گزار گزارش امر را با درج نام پیشنهاد دهنده‌گانی که در این جریان شرکت داشته‌اند، برای اقدام قانونی، به مراجع ذیصلاح و معاونت بونامه ویژی و نظارت راهبردی ارسال خواهد کرد.

-۳۳- شرکت کنندگان در مناقصه مجاز هستند سوالات و ایهامات خود در مورد استناد مناقصه را، صرفاً تا حد اکثر ۳ روز قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت با مراجعة حضوری به واحد مدیریت پیمان و رسیدگی



شماره: ۱۳۹۸/۱۲۷۲۴
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
جواز شماره:



شهرداری قزوین
(QAF)

شهرداری مرکز

شهرداری مرکز یا به صورت کتبی به این واحد ارسال نمایند و پاسخ استعلامات کتبی انجام شده طی نامه رسمی به آدرس شرکت کننده ارسال خواهد شد.

-۳۴ بودا خت هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

نام و نام خانوادگی و اعضاء عجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده:

سیاوش طاهر خانی
شهردار قزوین

به عنوان مالی اتصالی
بنت تهمی الحسینی

سید احمد موسوی
متولی حقوقی

مهدیر حشف نونه
گردشگری بازآفرین
بلواره هرانه

اعتزاز
متولی بیانی و رسیدگی
سید محسن استخاری





شهرداری
کاظمین
(۱۳۸۶)

شهرداری مرکز

تعهد فاعله پیشنهاد دهنده در مورد شمول قانون منع مداخله کارمندان

در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

موضوع عناصره: بروزه عملیات احداث پارک صافر واقع در منطقه نمونه گردشگری بازدید

پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه، بدینوسیله تأیید می‌نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، مصوب دیمه ۱۳۳۷ لعنی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

معجنین قبول و تأیید می‌گردد: که هر گاه این پیشنهاد دهنده برندۀ مناقصه فوق تشخیص داده شود و پعنوان فروشنده انتخاب گردد و خلاف اظهارات فوق تا تحويل موضوع مناقصه و تسویه حساب نهایی به اثبات برسد، یا چنانچه افرادی را که عشمل ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این معامله سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن‌ها محول کند. شهرداری حق خواهد داشت، که از تحويل موضوع مناقصه خودداری و هر نوع سهده و یا مطالبات فروشنده را ضبط و خسارات واردۀ در اثر فسخ معامله و تأخیر در اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارات واردۀ با تشخیص دستگاه مناقصه گزار می‌باشد.

پیشنهاد دهنده متوجه شود چنانچه در حین معامله به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافضلۀ به اطلاع خریدار برساند تا طبق مقررات به معامله خاتمه داده شود، بدینوی ا است چنانچه پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافضلۀ به اطلاع نرساند، نه تنها شهرداری حق دارد معامله را فسخ نموده و سپرده‌های مربوطه را ضبط نماید، بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می‌دارد که از مجازاتهای متوفّب بو متخلّفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلّف مستحق مجازاتهای مربوطه می‌باشد.

تاریخ:

نام و نام خانوادگی و اضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده





شهرداری قزوین
(آذک ۱۲۸۵)

شهرداری مرکز

مفهوم قرارداد

این قرارداد طبق آیین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به مراکز استانها و به استناد صور تجلیسه کمیسیون معاملات عالی به شماره مورخ به همراه شرایط خصوصی و عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و قرارداد نامیده می شود فی مابین شهرداری قزوین و به شناسه ملی ۱۴۰۰،۳،۲۹۶۷ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۶۹۱۴۴۸۹۱ به تماشندگی آقای سیاوش طاهرخانی که در این قرارداد کار فرما نامیده می شود از یک سو و شرکت به شماره ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادی به تعاونی که در این قرارداد، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، به شرح ذیل منعقد می گردد:

اسناد و کلمات استفاده شده در این قرارداد دارای معالی نسبت داده در شرایط عمومی قرارداد می باشد.

ماده ۱ - موضوع قرارداد

پروژه عملیات احداث پارک مسافر واقع در منطقه نمونه گردشگری باراجین قزوین مطابق با نقشه ها و مشخصات فنی خصوصی و عمومی و سایر مدارک و ملحقات پیوست قرارداد که جزو لاینگ قرارداد بوده و باید به همراه آن خوانده، درک و تفسیر شده و علاوه عمل قرار گیرند.

ماده ۲ - اسناد و مدارک حاکم بر پیمان به قریب اولویت:

این قرارداد، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) قرارداد حاضر.

ب) آیین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به مراکز استانها
ج) شرایط عمومی پیمان؛ ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳

د) پیوست ۱: شرایط خصوصی پیمان

۱) پیوست ۲: مقادیر مقطوع تجهیز و برقمند کارگاه، بر بنای فهرست بناهای همچنین خرایب جزء پیمان که در قیمت پیشنهادی پیمانکار ارائه شده است.





وزارت فرهنگ و
علم و تحقیق
(کرس ۱۲۸۶)

شهرداری مرکز

د-۱) فهارس بهای یابه قرارداد (ابنی، راه راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۸) به طور کامل و مشتمل بر کلیه صفحات و ضمایم مربوطه متفقین به قرارداد بوده و تماماً پیوست شده تلقی می‌گردند و فهارس بهای منضم به قرارداد تعریف می‌گردند.

تبصره ۱؛ تعریف کار:

کار شامل خدمات، وظایف و تعهدات که شامل اجرای عملیات در حوزه ساخت و تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و مواد و اجرای کلیه امور مربوط به موضوع قرارداد بر اساس مشخصات فنی خصوصی، مشخصات فنی عمومی، دستور العمل‌ها، استانداردهای فنی لازم الاجرا و نقشه‌های مورد توافق طرقی قرارداد (متدرج در ماده مربوطه) می‌باشد.

تبصره ۲؛ رعایت کلیه مقررات و نشریات فنی و دستورالعمل‌های لازم الاجرا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از جمله دستورالعمل ارزیابی مقاومت و پذیرش بتن و ... (مرتبط با طرح و اجرای پروژه) الزامی می‌باشد.

تبصره ۳؛ مشخصات فنی و استانداردهای کارهای موضوع قرارداد که بایستی توسط پیمانکار دقیقاً رعایت گرددند، به ترتیب اولویت، که تماماً پیوست شده و عبارت اند از:

الف) مشخصات فنی و خصوصی پروژه و یادداشت‌های ذیل و کنار نقشه‌ها.

ب) مشخصات فنی و عمومی منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نشریه‌های شماره ۱۲۰ و ۱۵۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (آخرین تجدید نظر).

ج) استانداردهای ملی ایران در ارتباط با کارهای موضوع قرارداد.

د) مجموعه مقررات بیست و دو گانه ملی ساختگان (درزهای مرتبط).

ه) سایر استانداردها و نشریات سازمان‌های بین‌المللی معتبر و مورد قبول کارفرما در ارتباط با کارهای موضوع قرارداد از جمله: ACI، ATSC، ASTM، ساختمان‌های فولادی و بازرسی کنتول کیفیت جوش، استانداردهای سازمان تحقیقات مسکن و دفتر نظام مهندسی و سازندگان معتبر و هوسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و سایر نشریات و استانداردهای معاونت فنی نظارت راهبردی ویاست جمهوری.

ح) نقشه‌ها

ش) اسناد تکمیلی گزارش‌های تأیید شده از سوی دستگاه نظارت و صورت مجالس و دستور کارهایی که در حین قرارداد و در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به پیمانکار ابلاغ می‌شود و یا بین دو طرف قرارداد مبادله می‌شود، این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورت مجلس باشد.



شماره
کاخی:

قبصره ۴۰ صور تجلیسات، توافقنامه‌ها، تفاهمات یا هر نوع سند دیگری در مورد کار، قیمت و تعهدات که در طول عدت قرارداد و در حین اجرای کار بر طبق استاد و مدارک قرارداد توسط طرفین تبیه و امضاء شوند، آن دند بخشش‌های جدایی، تایید قرارداد تلقی شده و جزء ضمانت قرارداد محاسب می‌شوند.

قیمتیه ۳: مدارک مذکور در موضوعات خود، به ترتیب از (الف) تا بند (ش) از بالا به پایین بر مدارک و پیوستهای تحتانی ذکر شده در ذیل خود ارجحیت خواهند داشت. پس از آن در صورت تکرار اسناد فوق چنانی موضوعات مشارک، اولویت آنها نسبت په هم بر حسب ترتیب ذکر از بالا به پایین خواهد بود.

ماده ۳ – مبلغ قرارداد و مبلغ تجهیز و برجستن کارگاه:

مبلغ اولیه قرارداد ریال به حروف (..... ریال) می باشد که بر مبنای فهارس بیهاء ابتهیه، راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۸ و اعمال فرازیب بیان است که با توجه به اسناد و مدارک قرارداد قابل تغییر است و کارفرما این مبلغ را در قبال انجام خدمات موضوع قرارداد به شرح زیر پرداخت می تعاوند:

الف) جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و کاهشی مقادیر و حذف آنها باید از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد بسته شود.

ب) فیمت میناء هورد نوافق کارفرما و پیمانکار با ضرایب و مقادیر زیر محاسبه گردیده است:

ضریب پیمان:

خوبی کل پیمان است.

۲) خواص جزء

برای هر فصل فهارس بیانی واحد یا به سال ۱۳۹۸ اعمال ضوابط مندرج در فهرست بهای مربوطه، مطابق با جدول پخشش‌نامه ۷۷۵۷۴۰۰ است.

مبلغ تجهیز و بروجیری کارگاه:

مطابق پیوست مریبوط در فهرست بهای یا اینه ییمان یا اعمال ضریب جزء به هیزان ریال
 ریال) و به صورت مقطوع و به شرح ردیفهای آن و مطابق با برآورده منضم
 به ییمان میباشد، که با انجام کامل هر ردیف و تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت میباشد.



تاریخ:

کاخ:

پروتکل:

شمردادی مرکز

کد: ۱۴۸۵

ماده ۴- تغییل آhad بجهه پیمان و ماهه المقاومت و اضاله بجهه و هزینه کارهای جدیده

- ۱- قیمت‌های واحد مربوط به عملیات موضوع قرارداد بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۹/۱۵ معاونت راهبردی ریاست جمهوری کشور تغییل خواهد شد.
- ۲- تغییل این قرارداد بر اساس شاخص‌های بایه سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ معاونت فنی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خواهد بود.
- ۳- برداخت هزینه‌های کارهای جدید مطابق پیوست مربوط در فهرس بعای منضم (نحوه تعیین فیعت کارهای جدید پیمان‌هایی که بر اساس فهرست بجهه پایه قرارداد متعهد شده‌اند) خواهد بود.

ماده ۵- پیش پرداخت و روش پرداخت صورت وضعیتها:

۱- پیش پرداخت:

شهرداری الزامی به پرداخت پیش پرداخت ندارد و در صورت پرداخت (به میزان ۲۰ درصد)، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن مطابق بخشنامه ۱۴۳۴۰۲/۱۴۵۹/۵ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ است.

۲- پرداخته:

کارفرما می‌تواند قسمتی از مطالبات پیمانکار را به صورت غیر نقدی و از طریق واکذاری املاک با رعایت قوانین و مقررات و تشریفات لازمه شهرداری انجام دهد.

* نکات ذیل می‌باشد در تمامی صورت وضعیتها و عایت گردید:

الف) پس از بیان هر ماه پیمانکار باید صورت وضعیتی در حداقل ۵ نسخه به شکلی که به تایید مستگاه نظارت رسیده باشد و با جزئیاتی که لشان دهنده اجرای مبالغی باشد که پیمانکار خود را محق به دریافت آن‌ها می‌داند همراه با مدارک پشتیبان کافی، از جمله گزارش پیشرفت و صورت مجلس و دستور کارهای نتایج آزمایش‌ها و سایر مدارک استند مورد نیاز به ثابتیابنده تمام اختیار کارفرها تسلیمه نماید، مبلغ صورت کارکرد مذکور پس از بورسی و تایید ثابتیابنده عذکور و کسر کسور قانونی به حساب بستانکار پیمانکار منظور و کار برگ مربوطه صادر می‌گردد تا مورد اقدام‌های بعدی برای پرداخت قرار نگیرد.

ب) پیمانکار موظف است تمامی مدارک اضافی مورد درخواست و نیاز کارفرما را جهت بورسی کارفرها ضمیمه و ارسال نماید.

ج) مقادیر مربوط به پرداخت‌های قبلی، پیش پرداخت، حسن انجام کار، کسر قانونی و قراردادی طبق قوانین حاکم؛ از هر پرداخت پیمانکار کسر خواهد گردید.





جمهوری اسلامی
ایران (۱۳۸۶)

شماره مرکزی

د) پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرما می‌باشد که با رعایت قانون، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

ماده ۶ – تاریخ تغییر، مدت قرارداد و تاریخ شروع به کار:

الف) تاریخ شروع به کار:

این قرارداد از تاریخ تحويل زمین نافذ بوده و این تاریخ به عنوان تاریخ شروع به کار می‌باشد.

ب) مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ تحويل زمین تا تاریخ تحويل موقت کار ۴ ماه کامل شمسی (چهار ماه) بوده و این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۲۰ شرایط عمومی قرارداد می‌باشد.

تبصره ۷: پیمانکار متعدد است به جهت تسريع در کار، در مدت حداقل ۲۰ روز از تاریخ شروع کار نسبت به تجهیز کارگاه و اقدامات لازم جهت شروع عملیات موضوع قرارداد، اقدام نماید.

ماده ۷ – خصائص فامه انجام تعهدات و حسن انجام کار و دوره تضمین:

۱- خصائص فامه انجام تعهدات، به مبلغ به حروف و بالبرابر پنج درصد کل مبلغ قرارداد، به شعاره مورخ لفایت بانک شعبه می‌باشد تحويل کارفرما گردید تا در صورت تغیر و یا عدم انجام تعهدات کلا و یا جزوی تسبیت به هبیط آن اقدام خواهد شد که این تضمین پس از پایان مدت قرارداد مطابق با شرایط عمومی پیمان به پیمانکار مسترد خواهد شد.

۲- کسور وجه الضمان: بایت حسن انجام کار مبلغ معادل ۱۰٪ از هر صورت وضعیت تایید شده پیمانکار کسر و نزد کارفرما باقی می‌ماند که در صورت رخصایت تیمی از آن پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و مابقی پس از ابلاغ صورت جلسه تحويل قطعی، از طرف کارفرما آزاد می‌گردد.

۳- دوره تضمین:

حسن انجام کار موضوع قرارداد از تاریخ تحويل موقت یا تاریخ ۵ پنجمی که طبق ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تعیین می‌شود و برای مدت ۲۴ ماه کامل شمسی از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و در طول این مدت، طبق ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

۴- مسئولیت‌های دوره تضمین:

اگر در دوره تضمین معايب و نتایجی در کار مشاهده شود که ناشی از کار پیمانکار باشد پیمانکار مکلف است با ابلاغ کارفرما ظرف حداقل مدت ۱۵ روز تسبیت به رفع معايب و نتایج به طوری که مورد قبول





سازمان تأمین اجتماعی
(آستانه شفافیت)

شماره ای مرکز

کارفرما باشد اقدام نماید و هزینه آن به عهده پیمانکار می‌باشد و هر گاه پیمانکار از انجام موارد ثقوق قصور نموده و یا به مکاتبات کارفرما توجه ننماید کارفرما می‌تواند نسبت به وضع معاویت فوق اقدام نموده و هزینه آنرا به انحصار ۱۵٪ از محل مطالبات، تضامین یا سپرده‌های پیمانکار برداشت نماید.

ماده ۸- جرایم تأخیر در اجرای بروزه و تعلیق:

- ۱- جرایم تأخیر در اجرای کار بر اساس شرایط مندرج شرایط عمومی پیمان ماده ۵۰، محاسبه و کسر می‌گردند.
- ۲- در صورت حدوث تعلیق، فرازداد تابع شرایط عمومی پیمان می‌باشد.

ماده ۹- نظارت بر اجرای کار:

نظارت بر اجرای عملیات موضوع قرارداد طبق استناد و مدارک فرازداد، به عهده منطقه نمونه گردشگری باراجین قزوین و یا بر عهده مهندسین مشاوری که از طرف کارفرما و به هزینه وی انتخاب می‌شود خواهد بود، وظایف دستگاه نظارت همان است که در ماده ۲۲ و ۳۲ شرایط عمومی پیمان بدان اشاره شده است و پیمانکار مکلف به اجرای کار با رعایت دستور کارهای دستگاه نظارت، مشخصات فنی و استناد و مدارک فرازداد می‌باشد.

در هر حال نظارت کارفرما رافع مسئولیت‌ها و تعهدات پیمانکار نخواهد بود.

تصویره A: کارفرما به عنوان ذیحساب نسبت به امضا این قرارداد اقدام نموده و پیمانکار مسئولیت رعایت اجرای کلیه بخش‌نامه‌ها و مقررات و آیین نامه‌های مربوطه از جمله آیین نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی و شرایط عمومی را عهده‌دار می‌باشد.

ماده ۱۰- تعهدات پیمانکار:

- ۱- پیمانکار متعهد است خدمات خود را طبق استناد و مدارک فرازداد، در ازای دریافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام می‌نماید که دارای توان و تشكیلات لازم برای انجام این خدمات می‌باشد
- ۲- رعایت کلیه قوانین و مقررات جاریه کشور از جمله آیین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به هرگز استانها به همراه اصلاحات و الحالات بعدی آن، قانون کار تامین اجتماعی و رعایت آیین نامه حفاظت فنی کارگاه‌های ساختمانی و نیز حوادث تاسی از کار و کلیه مسئولیت‌های مربوط به پرسنل، اینستی در کارگاه، حفظ و ذکرداری مصالح مصرفی عهده‌دار پیمانکار می‌باشد.





جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی

شهرداری مرکز

۱۰/۱۳۹۸/۴۱۷۶۲

شماره:
۱۳۹۸/۱۲/۲۲
نامه:
پرسنل

-۳ رعایت آئین نامه پیشگیری و هبازه با رشوه در دستگاههای اجرانی به شماره ۷۷۳۴۷۷/۵/۵۰۳۷۴

مورد ۱۲۸۳/۱۲/۲۲

۴ اتباع بیگانه:

بیمانکار متعهد می‌گردد کلیه مواد قانون کار بالاخص ماده (۱۸۱) قانون فوق الذکر مبتنی بر خودداری اکید از بکارگیری و استفاده از خدمات نیرو انسانی اتباع بیگانه غافد پروانه کار و یا افرادی که اعتبار مجوز اشتغال آنان سپری شده است را رعایت نمایند. همچنین بیمانکار مکلف است از بکارگیری افراد صغر سنی و کودکان و نوجوانانی که هنوز به سن کارگویی فرسیده‌اند خودداری نماید و نیز از بکارگیری کارگران بدون فراردادهای مشخص و شراف و یا به نفع کارفرما بیان که در آنها حقوق حفظ کارگران لحاظ و رعایت نشده است برهمیز کنند لذا عدم رعایت مواد فوق الذکر متوجه بیمانکار خواهد بود.

-۵ اعلام عدم شمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی:

بدمنویله نماینده مجاز و رسمی بیمانکار تایید می‌نماید خود و شرکاء و همچنین وابستگان وی و شرکاء شمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی مورخ ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ تبوده و متعهد می‌گردد اگر درین اجرای کار هر کدام از افراد مذکور شمول قانون فوق گردد بلا فاصله موضوع را به اطلاع کارفرما برساند و چنانچه خلاف آن به اثبات برسد کارفرما حق دارد قرارداد را تغییر کرده، ضمانت‌نامه بیمانکار را ضبط نموده و لسبت به جبران هر گونه خسارتی که در نتیجه لغو قرارداد و تغییر حاصله در کار رخ دهد از اموال بیمانکار تأمین نماید.

ماده ۱۱-فسخ قرارداد

-۱ تشخیص تخلف از مقادیر قرارداد و هزینه خدمات قابل قبول پس از اعلان فسخ به عهده دستگاه نظارت بوده و فسخ قرارداد به بیمانکار طرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تحقق شرایط فسخ ابلاغ خواهد شد که در صورت فسخ، ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار بیمانکار به نفع شهوداری ضبط خواهد شد.

-۲ تحت هیچ عنوان حقوقی از قبیل وکالت، عباشرت، تیابت، شراکت و غیره، بیمانکار نمی‌تواند این قرارداد را جزوی یا کلأ به شخص ثالث واگذار نماید. در صورت عدم رعایت این بند کارفرما می‌تواند راساً این قرارداد را لفسخ نماید بدینه است شرط اخیر ضعن حفظ کلیه حقوق ناشی از آن، مانع از جذب بیمانکاران جز از سوی بیمانکار به منظور اجرای عملیات عمرانی موضوع قرارداد نخواهد بود.

-۳ هر گاه بیمانکار ورشکست گرد و اعلام ورشکستگی نماید و یا منحل شود (اشخاص حقوقی)





شهرداری قزوین
(آذین ۱۴۸۶)

شهرداری مرکز

۱۰/۱۳۹۸/۴۱۷۶۲

شماره: ۱۳۹۸/۲/۲۴

تاریخ:

وضعیت:

۴- در سایر موارد قانونی خصوصاً تخلف از اجرای مفاد قرارداد مطابق با شرایط عمومی پیمان تسبیت به فسخ قرارداد اقدام می‌گردد.

ماده ۱۲- حل اختلاف قرارداد

مطابق ماده ۲۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران و اصلاحیه آن اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه تنها در هیأت حل اختلافی مستقر در شهرداری قزوین و با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مریوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار و نماینده پیمانکار قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرقین قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۱۳- نشانی طرفین:

نشانی کارفرما: قزوین، خیابان شهرداری، ساختمان شهرداری مرکز قزوین کدپستی: ۳۴۱۳۶۸۵۹۳۱
تلفن: ۰۳۳۲۲۷۰۰۱، ۰۳۳۲۲۷۰۰۴، نمبر: ۴۴۲۲۰۸۷۹

نشانی پیمانکار:
هرگاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد، باید طرف مدت پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می‌شود و دریافت شده تلقی می‌گردد.
این قرارداد در ۱۳ ماهه و ۴ نسخه تنظیم گردیده که همگی نسخ حکم واحد را دارند.

کارفرما	دستگاه نظارت	پیمانکار
شهرداری قزوین	منطقه نمونه گردشگری باراجین	شرکت
سیاوش طاهرخانی	داود میراشه	



شماره: ۱۳۹۸/۲۲۷۷۴
کامپیو:
پیوسته:
.....

شهرواری مرکز

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف بخشی از موارد در آن‌ها، به شرایط خصوصی پیمان موقول شده است و هیچگاه نمی‌تواند شرایط عمومی پیمان را تغییر کند. از این دو، هر گونه تغییره گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنها و بدون توجه به مفاده ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است.

بجز پیوست‌های این شرایط خصوصی که جزو لاینک فوارداد محسوب می‌شوند، شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. نوجه: آخرین نسخه شرایط عمومی پیمان، ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۰۴/۱۰۸۸ و ابلاغ اصلاحیه شماره ۱۰۰/۷۰۱۶ مورخ ۱۰/۱۳۱ ۱۴۸۸/۱۰۳۷۸ از این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷-الف) پیمانکار متعهد است، برای اجرای موضوع پیمان تعداد نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده در ذیر به کار گذارد.

این پروزه نیاز به کارشناس خارجی ندارد و این بند در این فوارداد موضوعیت ندارد.

ماده ۱۸-ب) آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۱۵ (پانزده) روز از تاریخ مبادله پیمان می‌باشد.

جزییات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن به شرح زیراست:
تهیه برنامه زمانبندی اجرایی و ندارکاتی باید از یکی از روش‌های کنترل پروژه و با توجه به مانعین آلات، معادن، مصالح، نیروی انسانی متخصص و عادی، وضعیت جوی، فواصل مراکز تهیه مصالح و لوازم و دیگر عوامل مؤثر در امور اجرای پروژه تهیه و بد تایید مهندس مشاور و کارفرما رسانده شود.

برنامه زمانی تفصیلی می‌باشد شامل موارد ذیل باشد:

- تعداد ردیف‌های برنامه جهت کار ساختهای، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی و محوطه سازی باید معرف هر قسمت باشد.

- کل هزینه هر ردیف در مقابل ردیف نوشته شود و طول زمان اجراء عملیات در آن معین گردد.

- با استفاده از میزان کارکرد هر ردیف، جمع عملیات در یک ماه و مبلغ کل ردیف در ذیل آخرین ردیف کارهای مختلف نوشته و درصد کارکرد آن ماه نسبت به کل پروژه در ذیل آن نوشته شود.

- برای هر ردیف کاری، دوره تهیه مصالح و حمل به کارگاه معین شده و در ذیل هر ردیف، محلی برای درج پیشرفت واقعی منظور شود.

- تعداد گروه اجرایی و مانعین آلات لازم برای هر ماه، در ذیل پیشرفت ماهیانه درج گردد.





دستورالعمل
۱۴۰۵/۲۲۷۲۹

شهرداری مرکز

۱۰/۱۳۹۸/۴۱۷۶۶

تاریخ: ۱۳۹۸/۲۲۷۲۹

نامه:
پیوست

ماده ۱۸-۵) گزارش پیشرفت باید شامل: مشخصات فیروی انسانی (نفو- وزن)، مصالح واردہ به کارگاه، لیست بازدیدکنندگان از پروردگار، شرایط جوی، هاشین آلات و تجهیزات و کارهای انجام شده، بطور کامل باشد.

بیمانکار مکلف است بر اساس برنامه زمان بندی مصوب، گزارش پیشرفت کار را با هماهنگی نظارت مقیم تنظیم و جمع‌بندی آنرا در پایان هفته پس از تایید دستگاه نظارت مقیم به دفتر مهندس مشاور یا کارفرما ارسال نماید. گزارش های هفتگی که به این صورت تهیه می‌شوند باید در پایان هر ماه به همراه یک نسخه برنامه زمانبندی که عملیات انجام شده (با توجه به ماده ۱۸-۵- شرایط عمومی بیمان) روی آن منعکس شده باشد، به مهندس مشاور یا کارفرما ارسال نماید. مهندس مشاور یا کارفرما پس از بررسی و اعلام نفو حداکثر تا هفتم ماه بعد گزارش فوق را به دفتر مجری طرح یا کارفرما ارسال خواهد نمود. تاخیرات بیمانکار مطابق ماده ۲۰ شرایط عمومی بیمان در صورتی قابل رسیدگی خواهد بود که گزارشات مذکور مطابق این بند تهیه و ارسال شده باشد در غیر اینصورت کلیه تاخیرات بیمانکار غیر مجاز خواهد بود. برای هر گزارش ماهیانه، حداقل سه قطعه عکس در اندازه کارت پستال ۱۵×۲۰ سانتیمتر، که از عملیات اجرایی و پیشرفت کلی کار گرفته شده، با شرح لازم در پشت آن تهیه و همراه با گزارش ماهیانه ارسال نماید.

ماده ۲۰-الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختهای، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که دو زیر تعیین شده است، در اختیار بیمانکار قرار می‌دهد: کارفرما صرفا محل احداث پروره را در اختیار بیمانکار قرار خواهد داد و بیمانکار با توجه به فضای موجود و موقعیت و روش اجرا و چیدمان تایید شده توسط مهندس مشاور و کارفرما، می‌بایستی ساختهای از ساختهای تجهیز کارگاه را اجرا نماید و در صورت نیاز به فضای مازاد با هزینه خود و پس از تایید مهندس مشاور و کارفرما نسبت به تجهیز آن اقدام نماید و هزینه اضافی مازاد بر مبلغ تجهیز مربوطه پرداخت نخواهد شد. در حصورتی که کار در مسیری مانند اجرای پیاده رو سازی و مشابه انجام می‌شود و نیاز به تکرار تجهیز کارگاه باشد، بایستی تجهیز کارگاه متناسب با محل اجرا انجام شده و هزینه اضافی مازاد بر مبلغ تجهیز مربوطه پرداخت نخواهد شد.

بیمانکار موظف است با مسئولیت خود و قبل از اوانه پیشنهاد قیمت از محل اجرای پروره بازدید و از شرایط انشعابات مورد نیاز اطلاع کافی بدست آورد. هرینه تهیه و اجرای عملیات لوله کشی، کابل کشی، ... و نیز هزینه وصل و مصرف آب و برق و گاز و مخابرات موقت به عهده بیمانکار می‌باشد.





سازمان امور اجتماعی
کد پرسنل: ۲۴۲۶۵۶۳۱
(۱۴۸۵)

شماره مرکزی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

کارفرما بنا به درخواست پیمانکار جهت صدور معرفی نامه های مربوطه و نیز مکاتبات با سازمان ها و ارگان های مربوطه اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۰- ب و ۲۰- ز) کارفرما به شرح زیر مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تأمین می کند در این پیمان کارفرما هیچگونه مصالح، تجهیزات و ماشین آلاتی را تأمین نمی نماید.

ماده ۲۰- ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات و عایق نماید: تعایق ماشین آلات مناسب با کارهای اجرایی و برنامه زمانی تفصیلی تایید شده و مورد نیاز بروزه در زمان مناسب در بروزه می باشد آماده بکار بوده و در صورت لزوم، توسط مهندس مشاور و کارفرما اعلام خواهد گردید و پیمانکار ملزم به تهیه آن ها می باشد. لازم به ذکر است تأمین ماشین آلات و ابزار بیشتر از حداقل آن ها جهت پیشوفت بروزه و یا در شرایط خاص جزو تعهدات پیمانکار خواهد بود و باخت این هزینه مازادی برداخت نخواهد شد.

در زمانی که فضای کارگاه این اجازه را نمی دهد که پیمانکار ماشین آلات و ابزار اجرایی کار را در محل کارگاه تأمین نماید مکلت است با توجه به موضوع عملیات اجرایی، ماشین آلات و ابزار مورد نیاز آن قسمت را تهیه و پس از اتمام کار آن قسمت، با تأیید دستگاه نظارت نسبت به خروج آن ها از کارگاه اقدام نماید.

ماده ۲۰- ح) پیمانکار متعدد است برای کارگاه کارگاه، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر دفتر کارگاهی، مسکن و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر تأمین کند: مطابق و دلیل تجهیز کارگاه تأمین می شود.

ماده ۲۱- ح) قسمت هایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حواله هی که باید مشمول بیمه گردد به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است که کل عملیات موضوع پیمان را بطور کامل در مقابل حوادث غیرمتوقبه (سیل، آتش سوزی، زلزله و ...) که نوع آن را کارفرما مشخص می نماید، نزد یکی از شرکت های محترم و مورد نایید کارفرما به نفع کارفرما بیمه نماید. (بیش نویسن آن می باشد به تأیید کارفرما برسد).

این بیمه نامه باید از شروع کار تا تحويل وقت و زمان رفع نواقص انتبار داشته باشد. هزینه بیمه مذکور بر اساس قوارداد و ارائه فاکتور معابر جهت مدت مجاز قانونی به عهده کارفرما خواهد بود و در زمان بروز هر گونه تأخیر غیر مجاز در مدت فوق به عهده پیمانکار و به حساب بدھی پیمانکار منظور خواهد شد.

بیمه پرسنل کارگاهی، دستگاه نظارت و افراد بازدیدکننده و اشخاص ثالث که به هر دلیل در محوطه کارگاه و یا اطراف آن تردد می نمایند در مقابل حوادث ناشی از اجرای کار به عهده پیمانکار می باشد.





سازمان شهری
آسیا (YAP)

شهرداری مرکز

بیمه تجهیز کارگاه مطابق بند ۱۵) ماده ۲۱ اشرایط عمومی پیمان و بند ۳-۶ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه (پیوست فهارس پها) به عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده ۲۱-و) هزینه اجرای مسیر احراfi در صورتی به حساب بستانکاری پیمانکار لحاظ خواهد شد که در برآورد منضم به پیمان آورده شده باشد.

چنانچه در حین انجام عملیات نیاز به احداث راه احراfi باشد طبق دستور دستگاه نظارت و تصویب کارفرما هزینه های مربوطه بر اساس فرخ پیمان محاسبه و پرداخت خواهد شد. بدینه است جهت احداث و نگهداری راه های دسترسی هیچگونه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

ماده ۲۲-الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی، که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد به شرح زیر است:

یک نسخه از نقشه ها، مشخصات و قرارداد بطور رایگان توسط کارفرما به پیمانکار تحویل خواهد شد و در صورت نیاز به نسخ اضافی هزینه آن توسط پیمانکار پرداخت می‌شود.

ماده ۲۲-ج) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعمل های راه اندازی، تعمیر، نگهداری، راهبری و نقشه های جون ساخت که پیمانکار تهیه می‌کند، به شرح زیر است:

-۱ برای کلیه دستگاهها دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری، لیست قطعات یدکی و تارخانجات شرکت های سازنده تهیه و پنهانگام تحویل موقت در سه نسخه به کارفرما تحویل نماید.

-۲ از عملیات انجام شده نقشه های جون ساخت (As Built) تهیه و اصلاحات موردنیاز را با دستگاه نظارت و تایید ایشان اعمال کرده و پنهانگام تحویل موقت در اختیار کارفرما قرار دهد. پیمانکار موظف است برای شروع هر نوع فعالیت اعم از معماری، سازه و تاسیسات (برقی و مکانیکی) نقشه های کارگاهی (Shop Drawing) تهیه و پس از تصویب مشاور و کارفرما نسبت به شروع عملیات مطابق نقشه های مذکور اقدام نماید. نقشه های تهیه شده بصورت لوح فشرده و با دو سری نقشه در قطع A3 آراane گردند.

ماده ۲۴-ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت نماید:
کلیه پیمانکاران جزء باید به تایید دستگاه نظارت برستند و اگر فعالیتی که پیمانکاران جزء برای آن انتخاب می‌شوند بصورت کلی باشد (مانند اسکلت سازان، نمایکاران، تاسیسات کاران و...).

پیمانکاران جزء باید به تایید کارفرما نیز برستند.

ماده ۲۴-الف) پیمانکار زمین موردنیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین می‌کند:
 محل تجهیز کارگاه با نظر و تایید نصایندگان کارفرما و مشاور مشخص خواهد گردید و پیمانکار موظف به محصور نمودن اطراف آن طبق مقررات و نظر کارفرما می‌باشد.



شهرداری مرکز

۱۰/۱۳۹۸/۴۱۷۶۲

شماره: ۱۲۷۲۸/۱۲۷۲۹
تاریخ: ۱۰/۱۲/۲۰۲۳
بروست:

- ماده ۲۹-۵) تغییر ترخ پیمان به شرح زیر است:**
- ترخ این پیمان مطابق بخششانه شماره ۱۰۱/۲۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۹/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(دستور العمل نحوه تغییر آناد بهای پیمان ها) یا بخششانه های تکمیلی ابلاغی تعديل می شود.
 - شاخص دوره مبنای کار مطابق بخششانه فوق سه ماهه چهارم سال ۹۸ می باشد.

ماده ۲۲-ج) نوع و تعداد آزمایشات مربوطه، برای آزمایش مصالح و کارهای انجام شده پیمانکار، مطابق دستورالعمل ها و مقررات فنی و استانداردها و مطابق قرارداد کارفرما با آزمایشگاه مربوطه خواهد بود. مگر اینکه به تشخیص کارفرما، موارد دیگری ابلاغ شود، لذا هزینه این آزمایش ها به قرار زیر می باشد:

الف- در صورت ثبت بودن و مورد تأثید بودن نتایج آزمایش ها (توسط مهندس مشاور)، هزینه آن ها مطابق قرارداد کارفرها با آزمایشگاه، به عهده کارفرما خواهد بود.

ب- در صورت منفي بودن و مورد تأثید نبودن نتایج آزمایش ها و نیاز به آزمایش مجدد، هزینه آن ها مطابق قرارداد کارفرما با آزمایشگاه، به عهده پیمانکار خواهد بود.

ج- در صورت تکرار آزمایشات بند(b) فوق و تا اخذ تأثیدیه از آزمایشات، هزینه آن ها مطابق قرارداد کارفرما با آزمایشگاه، به عهده پیمانکار خواهد بود.

د- در صورتی که در مورد نتیجه آزمایش یا آزمایشاتی، پیمانکار معترض باشد و درخواست آزمایش مجدد نماید، پس از تأثید مهندس مشاور و همانهنجی کارفرما، هزینه آن ها مطابق قرارداد کارفرما با آزمایشگاه، به عهده پیمانکار خواهد بود.

هزینه تست و راه اندازی و تحويل موضوع مورد پیمان همراه با کلیه تجهیزات مربوطه به عهده پیمانکار می باشد.

تبصره: در صورتیکه کارفرما یا دستگاه نظارت نسبت به قسمتی از کار شک کنند، بقسمی که انجام آزمایش برای اخذ نتیجه لازم باشد، پس از انجام آزمایش اگر نتیجه آزمایش وضعیتی باشد هزینه به عهده کارفرما و در غیر اینصورت به عهده پیمانکار خواهد بود. در صورتیکه پس از انجام آزمایش نسبت به مصالح وارده و یا کارهای انجام شده نتایج منفي حاصل گردد، ضرورت اصلاح اقدامات انجام شده، کارفرما اختیار دارد که کل هزینه آزمایشیهای انجام یافته با نتیجه منفي را از محل صورت وقوعیت و یا دیگر مطالبات پیمانکار کسر نماید.

ماده ۳۵) در بافت وجود سهرده تعیین حسن انجام کار این پیمان طبق بند ۵ از ماده ۱۱ آیین نامه معاملات شهرداری تهران می باشد



ماده ۳۸-الف) میزان و ترتیب پرداخت های ارزی به پیمانکار برای متخصصان خارجی به شرح زیر است.

ماده ۳۸-ب) کارفرما از موره نیاز، برای تأمین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج از کشور تأمین می‌کند.
در این بیان کارفرما همچو غونه ارزی را تأمین ننم، کند و در این بیان موضوعیت ندارد.

۵۵-۳۸-۶) کارفرما ارز موره نیاز، برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام بوده شده است را طبق شاباطه زیر تأمین می‌کند.

کارفرما هیچ گونه ارزی را تامین نمی‌کند و در این پیمان موضوعیتی ندارد.
ماده ۳۹-ب) سرانکه موظف است، که سش از تکمیل کار، قسمت‌های زیر را می‌داند، که باع

هر یک از آن ها به شرح زیر تعیین شده است تکمیل کند و به گارفرما تحویل دهد.
در صورت ضرورت بهره برداری بخشی از عملیات موضوع پیمان، طبق برنامه تفصیلی و یا ایلاگریه های بعدی
عمل خواهد شد.

۴۷۵-۵) ماده‌یین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اعتماد کار به صورت احرازه در اختبار کارخانه قرار گیرد، به شرح زیر است:

در صورت فسخ بیان کارفرما با توجه به کارهای باقیمانده، لیست ماشین آلات مورد نیاز را مشخص کوته و بیامانکار موظف است ماشین آلات مورد نیاز را به صورت اجراء و بر اساس اعلان نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد تخریب آنها در اختیار کارفرما قرار دهد.

ماده ۴۹-ب) هزینه بالا سری پیمانکار در دوره تعليق به ميزان و ترتيب تعين شده در زير پرداخت مي شود: کارفرما، هاهانه مبلغ ۵ درصد متوسط کارکرد فرضي ماهانه را به پیمانکار هي پردازد و در صورتى که پيش از آغاز عملنيات موضوع بيمان، تعليق از سوي کارفرما ابلاغ گردد، ۸۰ درصد هزینه تعليق محاسبه شده، طبق اين بند به پیمانکار پرداخت مي شود.

ماده ۱۵-الف) در صورت اتمام پروژه پیش از موعد، کارگرها هزینه تسریع کار را به نفع تعیین شده در قرار یافته باشند.

ماده ۵۰-ب) خسارت تأخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصولاً می‌شود: طبق ماده ۵۰-ب ش اخط عمومی پیمان محاسبه کسر خواهد شد.





شهرداری قزوین
(آرس ۱۳۸۶)

شهرداری مرکز

شماره:

تاریخ:

پیوست:

((فرم پیشنهاد قیمت))

از شرکت / پیمانکاری

به: کمیسیون عالی معاملات شهرداری قزوین

موضوع: اعلام پیشنهاد قیمت براساس آگهی مناقصه شماره ۱۰/۱۳۹۸/۴۱۷۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶

اینچنان‌باشد که ملی به شماره با کد ملی به شماره به سمعت

از شرکت دارنده حق امضاء استناد و اوراق تعهد آور با کد انتصادی:

..... شناسه ملی به نشانی: کد پستی: تلفن ثابت: تلفن همراه:

من باشم: پس از مطالعه کامل استناد و آگاهی از شرایط حاضر است که به پروژه عملیات احداث پارک مسافر

منطقه نمونه گردشگری باراجین را طبق نقشه و مشخصات براساس قیمت جدول ذیل به انجام برسانم.

مبلغ برآورد اولیه: ۸/۴۵۵/۹۹۸ (هشت میلیارد و دویست و هفده میلیون و چهار صد و پنجاه و

پنج هزار و نیصد و نود و هشت ریال) بر اساس خواص مندرج در برآورد منظم به استناد.

مبلغ پیشنهادی کل: به عدد: ریال و ریال

به حروف می‌باشد.

ضریب پیشنهادی کل بیان: به عدد به حروف می‌باشد.

* کارفرما می‌تواند قسمتی از مطالبات پیمانکار را به صورت غیر قدری و از طریق واکسداری اسلامک با رعایت قوانین و مقررات و تشریفات لازمه شهرداری انجام دهد.

* شهرداری الزاماً به پرداخت، پیش پرداخت ندارد.

* مبلغ پیشنهادی می‌باشد بر اساس بخشناهه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ و ۹۶/۱۲۳۴۵۷۹

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ در خصوص نحوه ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکاران به فنگیک فصول فهرست بهاء ارائه گردد. به پیشنهادات فاقد جداول بخشناهه های فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* به پیشنهاد شرکت‌هایی که فاقد حداقل پایه ۵ رشته ابتدی باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* ضریب پیشنهادی کل فوق می‌باشد بر اساس ضرایب جزء فصول در استناد برآورده ضعیمه ارائه گردد.

مهر و امضا شرکت گذشته:



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
 شماره: ۱۳۹۸/۴۱۷۶۲
 پست:

چک لیست اسناد مناقصه

به منظور کنترل اسناد مناقصه . چک لیست زیر تهیه شده است تا از اشتباهات احتمالی پیشنهاد دهندهان در تکمیل و ارائه اسناد مناقصه جلوگیری گردد و پیشنهاد دهندهان مکلف می باشند این فرم را بر اساس اسناد و مدارکی که ارائه می دهند ، تکمیل و ارائه اسناد درخواستی را با زدن علامت تیک در محل مربوطه تایید و در ذیل برگه ها نیز مهر و امضانمایند.

توقفیع: منظور از مهر و امضای شرکت ، اعضای مدیر عامل و دارندگان حق اعضاء شرکت به همراه مهر شرکت عیا شد.

۱- پاکت الف شامل:

۱-۱- سیرداد شرکت در مناقصه به یکی از صورت های زیر مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه :

۱-۱-۱- بصورت ضمانت نامه عذربر بانکی

۲-۱-۱- بصورت واریز نقدی با ارائه فیش واریز

۲-۱-۲- بصورت سایر موارد مورد قبول و مندرج در اسناد مناقصه

۲- پاکت ب شامل:

۲-۱- چک لیست اسناد مناقصه که تماماً کنترل و تایید و به مهر و امضای شرکت رسیده باشد

۲-۲- گلیه اسناد مناقصه و دستورالعمل و مشخصات کلی مناقصه ، اسناد و مدارک پیمان (دریافتی از کارفرما) و گلیه مکتوپاتی که توسط مناقصه گزار برای شرکت گذشتگان در مناقصه ارسال شده است و که به مهر و امضای صاحبان املاک شرکت رسیده باشد بدون تغییر یا حذف و دخل و تصرف در اسناد فوق و در صورتیکه یک یا چند قسمت از اسناد مناقصه به مهر و امضای شرکت نرسیده باشد ، نسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمامی شرایط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده خواهد بود و چنانچه اسناد ارائه شده قادر مهر و امضای پیشنهاد دهنده باشد ، پیشنهاد ارائه شده عرودود تلکی می گردد و پاکت پیشنهاد قیمت قابل بازگشایی نمی باشد

۲-۳- تکمیل و ارائه فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار با مهر و امضای شرکت

۲-۴- تصویر تمام صفحات اسناد شرکت همراه با مهر و امضای شرکت

۲-۵- تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی همراه با مهر و امضای شرکت

۲-۶- تصویر آخرین آگهی تبلیغات شرکت در روزنامه رسمی همراه با مهر و امضای شرکت

۲-۷- ارائه برگه مشخصات سهامداران که به مهر و امضای شرکت رسیده باشد

۲-۸- تصویر گواهی تشخیص حسلاخته ، رتبه و رشته ، عارای اعتبار از سازمان سدیمه و برنامه زمزی کشور





شهرکاظمی
(شک) ۱۴۰۵

شهرواری مرکز

نامه: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
تاریخ:
پیوسته

۹-۱- ارائه فرم خود اظهاری در خصوص بروزه های دردست اجرا با مناقصه گزار در کلیه مناطق شهری که تحویل موقع نشده باشد به اتفاق اعلان پیشرفت رسالی و فیزیکی آنها و در صورت وجود مستنداتی دال بر عدم رضایت مناقصه گزار از شرکت گشته در مناقصه در طی سنتوات قبل، مدارگه دریافتی وی در گمیسیون مناقصه مفتوح نمی شود و شرکت گشته حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

۱۰-۲- تصویر تایید صلاحیت دارای اعتبار از اداره کار و امور اجتماعی

۱۱-۲- تصویر برای اصل گواهی تطبیق اعضاء دارندگان حق اعضاء شرکت از دفاتر استناد رسمی همراه با مهر برجسته

۱۲-۲- تصویر اصل تضامن و کارت ملی و ... مدیر عامل و دارندگان حق اعضاء شرکت

۱۳-۲- ارائه فرم آدرس قانونی شرکت بعلاوه خطوط تماس که به همراه اعضای شرکت رسیده باشد

۱۴-۲- ارائه برگ تجهذن‌نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی همراه با عهر و اعضا شرکت

۱۵-۲- تصویر تایید صلاحیت ایمنی دارای اعتبار همراه با عهر و اعضا شرکت

۱۶-۲- تصویر برای اصل وکالت نامه (در صورت وجود) از دفاتر استناد رسمی همراه با مهر برجسته

- ۳- پاکت ج شامل:

۱-۳- فرم پیشنهاد قیمت مطابق با فرم ارائه شده در استناد مناقصه که بدون شرط، لات گرفتگی، خدشه، ابهام و به هر دو صورت عددی و حروفی قیمت گذاری شده باشد و صرفا در صورت تداووت بین قیمت حروفی و عددی، قیمت حروفی و در صورت تفاوت بین قیمت جزء و کل، قیمت کل مورد قبول واقع می شود

۲-۳- پیشنهاد دهنده مکلف به ارائه آنالیز قیمت پیشنهادی در قالب فرم های الف تا چهار بر اساس دستور العمل ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی بیمانکاران به تفکیک فصل های ذهرست بیها، ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و در صورت عدم ارائه فرم های مربوطه، پیشنهاد قیمت شرکت گشته در مناقصه مردود میباشد

۲-۴- پیشنهاد دهنده مکلف به ارائه آنالیز قیمت پیشنهادی مطابق با فرم های ۱ تا ۴ بر اساس دستور العمل ۹۶/۲۲۷۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ نحوه ارایه تجزیه بیها همراه با پیشنهاد قیمت توسط بیمانکاران، ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و در صورت عدم ارائه فرم های مربوطه، پیشنهاد قیمت شرکت گشته در مناقصه مردود میباشد

کلیه موارد فوق رویت و وعایت گردید

مهر و امضاء شرکت گشته در مناقصه





شهرستان
قزوین
(نامه ۱۲۸۶)

شهرداری مرکز

۱۰/۱۲۹۸/۴۱۷۹۲

شماره:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تاریخ:

برسته

بررسی شماره - فرم خود اظهارات اعلام کارهای در دست آمده و ظرفیت آماده بکار

بطلاقی ماده ۱۸ آینین نامه اوضاع کارهای رعایت مذکورهای اجرایی، احتمالاً کلتهای زیر مذکور در ماده ۵۵ در ماده ۵۶ برای مثلاً کشت در ماده ۵۷ بردازه کارهای دو دست آمده و کارهای که افسر امور به نسبت به شرح زیر می‌باشد و با آنها از تلفیهای اجرایی پایه و وینه همچو از المثلثه و تقدیم کار محظوظ در دست آمده، ظرفیت آنها به کار لازم برای شرکت در مالکیت و ملک، قرارداد بردازه مذکور را مابین عرض نهضن شده دارند من هست.

علایق به عطیه و رهائی

ردیف	نام و نویه	زنشه کار	نم دستگاه اجرایی طرف	علایق هر کارهای کار	فرم خروج از	فرم خروج از	ردیف

بهای عرضه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تغییرات آنکه بکار مذکور را تایید ننماید، مدنوبت تغییر در امور ای روزه و بهده بیمه کار بوده است و مالیات ساده‌سازی اصلی رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت حقوق ارجاعی که برای این شرکت و دفاتر می‌گردد

نهضن شده بجهان و آمده آور

لاریخ

این برگه نه، لایه‌کش اسلام مالکیه بوده و ناید تبلیغ برگه بشهاده قیمت، به بیعتکار تحویل گردد و بمن از تکمیل شدن آن توسعه و منانکار بیشهک مذکوره در پایان اتفاقی اتفاق افتاده بجهان و همراه اسناد و مدارک موردن تبازیه می‌گذارند مدیریت و بروگه ریزی ارسال گردند.



تاریخ : ۹۸/۴/۱۵

کد پروژه : ۰۰۷

نام پروژه یا موضوع کار : پروژه سامت پارک مسافر باراجین

نام دستگاه اجرایی : مجموعه فنی باراجین

نام دستگاه نظارت : سازمان خدمات طراحی شهرداری تزوین

نام مهندس مشاور : آرمانشهر مینو

کد و عنوان طرح :

کد و عنوان پروژه :

نوع اعتبار : سایر منابع

مدت پروژه : ۳ ماه

مبلغ پروژه ویژه تبدیل :

۸'۲۱۷'۴۵۵'۹۹۸

رسال

ابتدیه

راد، راد آهن و باند فرودگاه

ابتدیه	۸'۲۱۷'۴۵۵'۹۹۸	رسال
راد، راد آهن و باند فرودگاه		

۶۰ پسر ایوب کلی نیز آورده یه پرسنگ

نام نویسنده: پژوهه سایت، پارک مصلحه پارسیان

۲۳

لایم دیستیگاه اچریاچی - معموریت فنی بازار احسان

238

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

三

حاصل ۲۴) ریم اعیان

صادرات
بلديات
ارتفاع
متناهية ايجي

دستور جهه : راه راه آهن و پارک خودرو

100

卷之三

11

« خلاصه عالی، آورده تفکیک فصول مختلف »

خود سمت بخواه، اینسته سال

۱۷:۰۵

دانلود نسخه دستگاهی از اینجا

فایل دویست و پانزده سال است یارکه مسیحی علاوه بر

تاریخ: ۱۳۹۵-۰۷-۱۸

نامه علی‌الدین مشاور : آغازینه معرفت

جذب و نجاح

1154

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست پهلا	سناره دار	جمع فصل بروال
۱	۱	عملیات بخارب	۵۷۰۲۸۰۰۷۶۰		
۲	۲	عملیات خاکی با مالین	۲۰۷۳۳۲۳۲۸۷		
۳	۳	عملیات بنایی با سنگ	۱۰۱۳۷۷۹۶۲۱۰		
۴	۴	قالب بندی فولادی	۱۴۶۷۶۷۷۷۸۷		
۵	۵	کارهای فولادی با میلگرد	۱۹۱۷۵۱۰۵۰		
۶	۶	بنن درجا	۴۷۰۹۹۴۲۷۲		
۷	۷	کارهای فولادی سنگین	۸۱۵۸۷۳۹		
۸	۸	آجرکاری و شفته ریزی	۲۷۰۷۳۰۶۴۰		
۹	۹	پن پوش ساختم و پلریج چنی	۵۸۵۷۵۴۵	۲۱۲۷۵۰۰	۷۹۸۷۴۰۰۵
۱۰	۱۰	دیق کاری رضوبتی	۹۷۷۲۵۰۰		
۱۱	۱۱	کارهای فولادی سبک	۷۹۰۷۲۶۸۰۷		
۱۲	۱۲	نودکاری و بندکشی	۱۰۵۰۰۷۰۹		
۱۳	۱۳	قوش موزاییک و کفپوش بتنی	۵۱۸۴۷۴۳۶	۱۱۱۲۲۲۵	۴۸۷۴۰۵۰۰
۱۴	۱۴	کارهای سکنی با سک ملاک	۱۱۷۰۰۸۳۷۵	۷۵۰۱۶۳۰۷	۷۸۰۷۷۶۸۰۰
۱۵	۱۵	کارهای بلاستیک و پلمری	۴۴۹۷۸۰۰		
۱۶	۱۶	رنگ آمیزی	۵۰۰۶۳۰۰		
۱۷	۱۷	زیرسازی و اسن	۱۰۲۹۴۱۶۷۳		
۱۸	۱۸	حمل و نقل	۱۷۸۴۳۰۰۰		
		جمع:	۱۵۰۷۷۱۷۵۰	۱۱۱۲۲۲۵	

جامعة بنها، كلية التربية

1975-1984

classmate.com

اُخْرَى مِنْهُ

13 of 14 pages

* مکالمہ ایضاً ملکہ سیدنا نبی مسیح

کندوں کی تحریر

۷۰

جغرافیا ایران

نام مهندسی مشاور : آرمانشهر صنعت

نام بروزه: بروزه ساپت پارک مسکونی بارجین

ج

جمع کل با اختصار صریح (نحوه):

مادر ناصیه زند و هشت دیال

أولادهم

八
卷之三

«خلاصه مالی پروژه بتفکیک قصول مختلف»

فهرست بهای اینیه سال ۹۸

کد پروژه: ۰۰۷

نام دستگاه اجرایی: مجموعه فنی بارگویان

نام پروژه: پروژه ساخت پارک مسافر بارگویان

تاریخ: ۹۸/۰۴/۱۵

نام مهندس مشاور: آرمانشیر حینو

کد و عنوان طرح:

مالیات به نقل

ردیف	فصل	شرح قصور	قیمت	ستاره دار	جمع فصل بریال
		اضافه میشود:	۶۷۱۰۰	۲۳۱۲۷۲۶	۲۳۱۲۷۲۶
		جمع:	۷۵۲۴۵۸۷۰۰		

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برجستن کارگاه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع کل بریال: ۷۵۲۴۵۸۷۰۰

«خلاصه مالی برآورده بتفکیک فصول مختلف»

فهرست بیهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۸

کد پروژه: ۱۰۷

نام دستگاه اجرایی: مجموعه فنی مارخین

نام پروژه: پروژه ساخت پارک هدایت راه راهنمایی

تاریخ: ۹۸/۴/۱۵

نام مهندس مشاور: آرمنشیر عینو

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ريال

ردیف	فصل	شرح فصول	الفهرست بیها	ستاره دار	جمع فصل بربال
۱۱	۱۰	کلارهای نولادی با میگرد	۲۶۲۱۷۰۲		۳'۲۴۱'۷۵۲
۱۰	۱۱	بتن پیش ساخته	۲۶۷۶۴'۳۶۰		۳'۷۷۶'۴۶۰
جمع: ۱۰'۵۱۲'۱۷۸					
جمع پیشون شراب: ۸'۰۶'۱۱۷					
اضافه میشود: ۲۵/۰۰					
اضافه میشود: ۰/۰۰					
جمع: ۸'۲۱۷'۲۲۲					
ضریب بلاسری: ۰/۹۹۱/۰۰					
اضافه میشود: ۰/۰۰					
جمع: ۸'۲۱۸'۲۲۸					
جمع کل بربال: ۱۱'۸۶۸'۲۲۸					

متوجه:

۵۵

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه و شرطه اینیه سال ۹۸

کد پروژه: ۰۰۷

نام دستگاه اجرایی: مجموعه فنی باراجین

نام پروژه: پروژه ساخت پارک مسافر باراجین

تاریخ: ۱۵/۰۴/۲۰۱۵

نام سیندس مشاور ارمانشهر میند

کد و عنوان طرح:

ردیف	شماره	شرح کامل	شرح ملاحظات	بهای واحد	مقدار	جمع برشمال
------	-------	----------	-------------	-----------	-------	------------

۱- عملیات تخریب

۱	۰۶۰۴۰۷	تخریب کنی ساختمانهای آجری، سنگی و یوکی با ملاتهای مخفف، شامل تمام ملذت تخریب	متوجه	۱۰۰۰-	۱۰۰۰۵۰۰	۹۰۰۵۰۰
۲	۰۶۰۴۰۸	تخریب بدنی های آجری، یوکی و سنگی که با ملات علیه سیمان، با پاکاره چیده شده باشد	متوجه	۱۰۰۰-	۱۰۰۰۷۵	۹۰۰۷۵
۳	۰۶۰۴۰۹	تخریب نوع پهن غیر مسلح، پاغر عیار سیمان	متوجه	۱۰۰۰-	۱۰۰۰۷۵	۹۰۰۷۵
۴	۰۶۰۴۱۰	تخریب بتن مسلح، با عوامار صیمان و بربین میل گرد	متوجه	۱۰۰۰-	۱۰۰۰۷۵	۹۰۰۷۵
۵	۰۶۰۴۱۱	برچین (تخریب) جدول های، بنی پیش ساخته	متوجه	۱۰۰۰-	۱۰۰۰۷۵	۹۰۰۷۵
۶	۰۶۰۴۱۲	بروش آسالتها کافر به عمق تا ۷ سانتیمتر (از زاره گیری) بر حسب طبقه هر خط (برچ)	متوجه	۱۰۰۰-	۱۰۰۰۷۵	۹۰۰۷۵
۷	۰۶۰۴۱۳	تخریب آسالتها بین موخطه برگ (با فاصله حد کمتر از ۱۵ متر) یا ساین متناظر که در پروژه بیل مکانیکی، ضخامت زای سنتیمتر و برد بین ای	متوجه	۱۰۰۰-	۱۰۰۰۷۵	۹۰۰۷۵

جمع فحول برشمال: ۹۰۰۷۵۰

«برگه هالی»

فهرست پهانی واحد رایه رشته ابتدی سال ۹۸

کد پروژه: ۰۰۷

نام دستگاه اجرایی: مجموعه فسی بر لجه

نام پروژه: پیوژه ساخت بلوك مصالح مراجون

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

نام مهندس ستاد: داماشهر منو

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل	شرح علاجفات	واحد	بهانی واحد	مشترک	جمع برهان
* - عملیات خاکی با حاشیه							
۱	۰۳۰۱۰۶	طبقه زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکبکر، بعمق تا ۱۵ سانتیمتر		مترمربع	۸۷۵۰	۰۷۰۰۰۰	۱۷۷۸۷۴۳
۲	۰۳۰۱۰۷	حاکب برداری یا کوبیداری در زمینهای نرم باقی و سله مکبکر، حمل مواد حاصل از خاکبرداری با قابلیت ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن آن		مترمکعب	۰	۰۷۰۰۰۰	۱۷۷۹۱۴۱۵۰
۳	۰۳۰۱۰۸	حاکب برداری یا گودیداری در رویهای سخت باقی و سله سکافی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری با قابلیت ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن آن		مترمکعب	۰	۰۷۰۰۰۰	۱۷۷۹۴۰۰۰
۴	۰۳۰۱۰۹	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی با خاکهای توده شده و حمل آن با کامپیون هر هر نوع ۱۰۰ متر با قابلیت ۲۰ متر قابلیت ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن		مترمکعب	۰	۰۷۰۰۰۰	۰۷۰۰۰۰۰۰
۵	۰۳۰۱۱۰	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی با خاکهای توده وقتی که ظاهره حمل بیش از ۱۰۰ متر با ۵۰۰ متر پائمه به افزایی عرض ۱۰۰ متر ساره بیش از ۱۰۰ متر اول، تکری ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود.		مترمکعب	۰	۰۷۰۰۰۰	۱۷۷۹۱۷۷۸
۶	۰۳۰۱۱۱	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی با خاکهای توده شده وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد برای هر کیلومتر ماراد بیش از ۱۰ متر اول، برای راه مان آسمانی (کسر کیلومتر به نسبت فیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	- مترمکعب - کیلومتر	۰	۰۷۰۰۰۰	۰۷۰۰۰۰۰۰	۱۷۷۹۱۶۰۳
۷	۰۳۰۱۱۲	آب پانی و گوییدن پسند شکریزها یا کافت شده ها، شائد آنها تا عمق ۱۵ سانتیمتر با برگردانه ۰.۵ درصد به روش آشواص‌افزایی	مترمربع	۰	۰۷۰۰۰۰	۱۷۷۹۱۷۰۸	
۸	۰۳۰۱۱۳	پخش، آب پانی، تبلیغ بروزگاه کردن، رگبار و کیسیدن قشرهای حکبیزی و توبنل، ۰.۵ درصد کیسیدنی بعروس آشواص‌افزایی، وقتی که خالصت قشرهای خاکبزی پس از کوبیده شدن حداقل ۱۵ سانتیمتر باشد	مترمکعب	۰	۰۷۰۰۰۰	۱۷۷۹۱۷۰۵	
۹	۰۳۰۱۱۴	پهپ، خاک شت پهپ از خارج کرگاه، برای افزایش تنشی گندم، بارگیری و حمل، با قابلیت ۵۰۰ متر با افزایی در حمل حصر.	مترمکعب	۰	۰۷۰۰۰۰	۰۷۰۰۰۰۰۰	
۱۰	۰۳۰۱۱۵	پخش خاکهای سایی ریشه شده، نظیر و ریگلز در محلهای مورد نظر.	مترمکعب	۰	۰۷۰۰۰۰	۰۷۰۰۰۰۰۰	

جمع فصل برهان: ۰۷۰۰۰۰۰۰

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه و شرطه اینیه سال ۹۶

کد پروژه: ۰۰۷

نام پروژه: پروژه سایت هارک مسافر مراحت

تاریخ: ۱۸/۰۴/۱۵

نام دستگاه اجرایی: مجتمعه فیزارجین

نام مهندس من مشاور: ارعان شهر منو

کد و عنوان طرح:

ردیف	شماره	شرح کامل	شرح ملاحظات	بهای واحد	مقدار	جمع برابل
------	-------	----------	-------------	-----------	-------	-----------

۱- عملیات بنایی با سنگ

۱۸	۰۰۱۰۲	سنگ رزی بست دیوارها و بیو ها (دریز) با سنگ قلمه	سنگ رزی بست دیوارها و بیو ها (دریز) با سنگ قلمه	هزار و ۳۵۰	۱۶۷۲۳۱۵۷۵	هزار و ۳۵۰
۱۹	۰۰۲۰۶	بنایی با سنگ لاشه و ملات مبت سیمان ۱۵ شر دیوارها و ستر محله هایی که بالاتر از بی فرار طرفند	بنایی با سنگ لاشه و ملات مبت سیمان ۱۵ شر دیوارها و ستر محله هایی که بالاتر از بی فرار طرفند	هزار و ۳۵۰	۱۶۷۲۳۱۵۷۵	هزار و ۳۵۰
۲۰	۰۰۳۰۴	آشناه دوا پوره و فهدی بنایی، با سنگ لاشه، بوای نماسازی با سنگ پادبر	آشناه دوا پوره و فهدی بنایی، با سنگ لاشه، بوای نماسازی با سنگ پادبر	هزار و ۳۵۰	۱۶۷۲۳۱۵۷۵	هزار و ۳۵۰
۲۱	۰۰۳۰۹	تمیه درز نقطاع در بنای های سنگی با تمام عملیات لازم و پنهان سکل	تمیه درز نقطاع در بنای های سنگی با تمام عملیات لازم و پنهان سکل	هزار و ۳۵۰	۱۶۷۲۳۱۵۷۵	هزار و ۳۵۰
۲۲	۰۰۴۰۲	بنایی فرش کف با سنگ لاشه، با خاکهای متوسط	بنایی فرش کف با سنگ لاشه، با خاکهای متوسط	هزار و ۳۵۰	۱۶۷۲۳۱۵۷۵	هزار و ۳۵۰
۲۳	۰۰۵۰۱	تهیه مصالح زعکشی ضيق مشخصات و به کاربردن آن در زلگشید	تهیه مصالح زعکشی ضيق مشخصات و به کاربردن آن در زلگشید	هزار و ۳۵۰	۱۶۷۲۳۱۵۷۵	هزار و ۳۵۰

جمع قص برابل: ۱۱۳۷۱۴۹۹۰۰۰۱

« پروژه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته اینیه سال ۹۶

کد پروژه: ۱۰۷

نام دستگاه اجرایی: مجموعه فن، بازیجنس

نام پروژه: سایت پارک مسافر بازیجنس

تاریخ: ۹۷/۴/۱۵

نام مهندس مشاور: آریانشهر میر

کد و عنوان طرح:

ردیف	شماره	شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمعیت بر هال
------	-------	-------------	------	-----------	-------	--------------

۱- قالب بندی فولادی

۲۴	۰-۰-۱۰۱	نهیه وسائل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پرینت و شناز عایی ای.	متوجه	۳۷۸,۰۰۰,-	۱۰۷,۶	۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۵	۰-۰-۱۰۲	نهیه وسائل و قابچه های با استفاده از قالب فولادی- مرای پنجه برازی پشت جذل، تکساری، سوزن، نگو و هزاره دهن.	متوجه	۲۲,۷۲۰,-	۲۵۷,-	۷۷۹۶۱۶۱...

جمع لصل بر هال:

«برگه مالی»

فهرست بیهای واحد یا به رشته اینیه سال ۹۸

کد پروژه: ۱۰۷

نام دستگاه اجرایی: مجموعه فنی پارچه

نام پروژه: پروژه سبت پارک مسافر پارچه

تاریخ: ۹۸/۹/۱۵

نام مهندس مشاور ارائه شده: مینو

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	بهای واحد	مقدار	جمع برمال
--------	-------	-------------------------	-----------	-------	-----------

۲- کارهای فولادی با میله‌گرد

۱۶۰۴۰.۵	۱۶۰۴۰.۵	جعبه پوشان خودکار گذاشتن می گردیدار رز	۳۱۰۷۲.	۱۱۱۹۵۱۶۵۳-	کیلوگرم
---------	---------	--	--------	------------	---------

جمع قابل بررسی: ۱۱۱۹۵۱۶۵۳

«برند مالی»

۹۸ سمت بیانی واحد پایه دو رشته ادبیه سال

- ٧ -

نام دستگاه احوازی: جمهوریه اسلامی ایران

قائم پروژه: وزیر سایت پارک مسافر پارچی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

نام مهندس، مشاور، ملکه میز

گد و عنوان طبع

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه و شته ابتدی سال ۹۸

کد پروژه: ۱۰۷

نام دستگاه اجرایی: مجتمعه فتو پاراجین

نام پروژه: پروژه صفت پارک مسافر مازن

تاریخ: ۱۴۷/۴/۱۵

نام مهندس مشاور: از رام شهر عینو

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل	شرح ملاحظات	بهای واحد پایه و شته ابتدی	مقدار	جمعیت بریال
--------	-------	----------	-------------	----------------------------	-------	-------------

۹- کارهای نولادی سنگین

۱۰۷۰۱	۰۶۰۷۰۷۰	۷۷۰۰۰۰	علی‌بوم	نوبه و مداخل قیاده، آتشی اتمالی و تصفیه داخل	۱۰۷۰۱	۱۰۷۰۱
				کارهای نسبتی، یا جالبی، غیل از اجزای تکارهای پادشاهی، از		
				آبشار، سیری، وزی، نسمه، میل گرد، لوله و مانند آن، با		
				شانکهای لزمند، جوتنگاری، برشگاری، سورنگاری و		
				سایرین، به صور کامل.		

جمع فعل بریال: ۱۰۷۰۱

«برگ مالی»

فهرست بهای واحد پایه زمانه اینده سال ۹۸

کد پروژه: ۱۰۷

نام حستگاه اجرایی: مجموعه فنی باراجین

نام پروژه: پروژه سایت هارک مسافر باراجین

تاریخ: ۹۸/۰۷/۱۵

نام مهندس مشاور: آرمان‌نژاد مینو

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کاعل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	هفدار	جمعیت بر طال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	--------------

۱۱ - آخرگاری و شفته ویزی

۲۵	۱۱۰۴۰۱	آخرگاری راچر فشاری به ساخته پک، زم اجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان ۱:۴	متراکعب	۴۷۶۰۰۰۰۰	۶۱۷۶۲	۱۳۷۹۰۴۰۰
۲۶	۱۱۰۴۰۵	دیوار یک آخره به آخر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۴	مترازیر	۵۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۸	۱۳۷۹۰۴۰۰
۲۷	۱۱۰۴۰۶	دیوار سیم آخره با آخر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۴	مترازیر	۱۰۰۰۰۰۰	۱۷۷۸	۱۳۷۹۰۴۰۰
۲۸	۱۱۰۴۰۷	شقه ویزی با جاذب محل و ۱۵۰ کیلوگرم آنک شکنده در متراکعب شفته	متراکعب	۵۷۱۶۰۰۰	۹۰۵۰	۱۳۷۹۰۴۰۰

جمع فعل بر طال: ۲۷۶۷۳۰۶۰

« پوکه مالی »

فهرست پهای واحد پایه رشته ادبیه سال ۹۸

کد پروزه: ۰۰۷

نام دستگاه اجرایی: انجمنه فنی پارسیان

تاریخ: ۹۷/۴/۱۵

نام مهندس شاور از مشترک میتو

نام پروزه: پروزه سایت پارک مسافر پارسیان

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح تاصل شرح ملاحظات	واحد	پهای واحد	عقدار	جمیع بورال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	------------

۱۶- پیش ساخته و پلوك چینی

۲۹	۱۲۰۱۰۴	تنهیه و نصب جدول هدی پرس ساخته پرسی، با مطلع قطعه ۳۶، مترمربع و با حداقل مقاومت استوانه نی استنکله ۲۸۰ کیلوگرم بر متر مربع	مترمکعب	۲۰۸۱۰۰۰/-	۳۱/۲۶	۷۷۱۰۵۷۰-
۴۰	۱۲۰۱۰۵	تنهیه و نصب حقول های پیش ساخته پرسی، با مطلع مطلع پیش از ۳۶، مترمربع و با سطح مقاومت استوانه ستنکله ۲۸۰ کیلوگرم بر متر متر مربع	مترمکعب	۲۰۸۱۰۰۰/-	۴۱/۲۶	۷۷۱۰۵۸۱۲-
۴۱	۱۲۰۱۰۷	تنهیه، ساخت و نصب لوله های پیش ساخته بران سکه گره لوله (pipe sleeper) و کارهای مشابه، با دیوار ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بن	مترمکعب	۲۰۸۱۰۰۰/-	۴۶/۲۶	۷۷۱۰۵۸۱۷-
۴۲	۱۲۰۱۰۹	تنهیه مصالح، حمل و احراری گفوبون بدنی پیش ساخته ساخته پرسی، به ضمانت ۴ متر متر متر و به سطح تا ۱۵ دسی مترمربع، برای هر کثیوت، با عنوان ملان ماسه سیمان	مترمربع	۱۴۲۱۵۰/-	۱۷۱۰۳/۶	۷۷۱۰۵۸۱۸-
۴۳	۱۲۰۱۱۴	اتفاقه پهای و پگی، پودر کفربوش پتیر، پیش ساخته پرسی	مترمربع	۷۱۵۰/-	۱۰۵۷۰۰	۷۷۱۰۵۸۱۹-

جمع خصل برش: ۷۹۳۴۰۰۰۰۰

«برگه هالی»

فهرست پهای واحد پایه و شنید ابتدی سال ۹۸

کد پروژه: ۰۷

نام دستگاه اجرابی: مجموعه فنی بازیخان

تاریخ: ۹۸/۴/۱۵

نام مهندس مشاور: آدمنشهر منو

نام پروژه: پروژه ساخت پارک مسافر برای چین

کد و عنوان طرح:

ردیف	شماره	شرح کامل	شرح ملاحظات	واحد	پهای واحد	مقدار	جمع بروال
۱۲ - عایق کاری و طوبی							
۱۳۰۳۰۴	۱۳۰۳۰۴	عایق کاری و طوبی، باعث پشت ساخته شده به مناسک از قیر پلاستیکی، الایا برای امنیت و نافذ و تیشو به ضخامت ۰/۵ متری متر به اندازه قشر آتش برای صایر سطوح	مترا مربع	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰
جمع نصن بروال:							
۱۷۲۹۶۰۰							

* بُرگه مالی *

فوجہ سنت پیاری واحد یا یہ دشمنہ اپنے سال

۱۰۷

نام دستگاه احیاء مجموعه فنون احمد

نام و نوبت و مکالمه بیانات پاکی میباشد

تاریخ: ۹۸/۴/۱۵

نام و نیتی، مشاور، مانشیر و مخ

کتابخانه ملی افغانستان

ردیف *	شماره	شرح کامل ملاحظات	شرح کامل	واحد	بهای واحد	منسداو	جمعیت بریال
--------	-------	------------------	----------	------	-----------	--------	-------------

۱۶ - گزارهای فن لادی، مسیگ

۱۴۰۱۳	۲۵		تجهیز، ساخت و نصب حفاظه، لرنده و ترددیان و فایلزاری فلزی کف پله ها از نبضی، مسیری، ناودانی و عملکرد ورق و دسته آن، با جاسازی و دستمزد، نصب برای آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم	کیلوگرم	۶۴۰۰۰/۰	۹۸۷۰۵	۱۴۰۱۴۶۰۰
۱۴۰۱۵	۲۶		تجهیز، ساخت و نصب مقاطعه هرده و تردیلن و فایلزاری فلزی کف پله ها از لوله سیاه و موافقه تو خالیه، با جاسازی و دستورد نصب برای آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم	کیلوگرم	۷۲۰۰۰/۰	۹۸۷۰۶	۱۴۰۱۴۷۰۰
۱۴۰۱۶	۲۷		تجهیز، ساخت و نصب دریچه هم، دریچه دار و کامپاری های قولاندی ها ورق ساده با اینسل، همر، با سیروی، نسبی، نسخه و سایر بروق های لازم با جوشکاری و ساییدن	کیلوگرم	۷۳۰۰۰/۰	۹۸۷۰۷	۱۴۰۱۴۸۰۰
۱۴۰۱۷	۲۸		تجهیز و نصب نور سیمی گلوایسر، زیر اندازه	متراز	۵۰۰۰۰/۰	۹۸۷۰۸	۱۴۰۱۴۹۰۰

جامعة فلسطين، بيت جال : ٢٠١٥/٦/٣٠

«برگه مالی»

فهرست مهای واحد پایه پنجمین سال ۹۸

۱۷

نام دستگاه اجرایی : مجتمعه فنی پاراچین

نام بیوگرافی: پروزه سایت پارک مسافر پاراچوی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

فایل سهندی، عثمان؛ آنالیز متن

گدھ عینلہ طیب

ردیف	شماره	ملاحتات	شوح کامل	واحد	پرسای واحد	مقدار	جمع برویال
------	-------	---------	----------	------	------------	-------	------------

۱۸ - آنودکاری و سندکشی

۵۹	۱۸۰۴۰۶	۱۹۷۰	۱۴۲۵۰۰	دترمینیج	اندو سیسائی به ضخامت حدود ۲ سانتی متر، روی سطوح فایبر، با علاوه نمای سیمان	۱۸۰۳۰۴
۶۰	۱۸۰۴۰۷	۱۹۷۰	۷۷۰۰۰	دترمینیج	اندو سیسائی با علاوه مسنه سیمان ۱.۵ به ضخامت حدود ۰.۵ سانتی متر، روی سطوح افقی	۱۸۰۴۰۷
۶۱	۱۸۰۴۰۸	۱۹۷۰	۱۲۵۰۰۰	دترمینیج	اندو سیسائی با علاوه مسنه سیمان ۱.۵ به ضخامت حدود ۰.۵ سانتی متر، روی سطوح افقی	۱۸۰۴۰۸
۶۲	۱۸۰۴۰۹	۱۹۷۰	۵۰۶۵۰۰	دترمینیج	شما سازی موزاییک، تنسه (شتر روبه) روی سطوح قالب و افقی به ضخامت ۱ تا ۱.۵ سانتی متر با علاوه موزاییک ۰.۵-۰.۷۵ و مشتمله کبریت شیشه، از با شیشه حدود ۰ میلی متری و ۰.۵-۰.۷۵ آن	۱۸۰۴۰۹
۶۳	۱۸۰۴۱۰	۱۹۷۰	۱۰۰۰۰۰	دترمینیج	تهیه سیمانی و آجرن در روشن روی دیوار (نگ طرفه با دو طرفه)، گل پنجه (داخل با خارج)، اندیمه آن، چکان، درز کمپاس و فالباری، با علاوه نمای سیمان ۰.۵	۱۸۰۴۱۰
۶۴	۱۸۰۴۱۱	۱۹۷۰	۸۷۷۷۰	دترمینیج	پند کشی نمای سیمانی پلستیک لاستیک و علاوه ماسه سیمان ۰.۵	۱۸۰۴۱۱

جامعة الملك عبد الله

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه و شنیده اینیه سال ۹۸

کد پروژه: ۰۰۷

نام حستگاه اجرایی: مجموعه فنی باراجین

نام پروژه: پروژه سایت پارک مسافر باراجین

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

نام سهندس مشاور: ارمغان‌شهر مبو

نکد و عنوان طرح:

ردیف	شماره	شرح کامل	شرح ملاحظات	واحد	مقادیر	جمع بریال
------	-------	----------	-------------	------	--------	-----------

۲۱- فرش موzaیک و گلپوش بتنی

۵۶	۲۱۰۴۰۵	تنهه صفحه، حمل و اسراز گلپوش های بتنی بیش ساخته پرسی، به مختارت ۴ سانتی مترا و به سطح تا ۱۵ دسمتریم برای هر کلپوش با ۳ سانتی متر مائمه قرم زیر آن و زیر چوب را زد	مشتمل	۱۷۹۷۰.۸	۱۷۹۷۰.۸	۲۰۵۲۳.۲۲
۵۷	۲۱۰۴۰۶	اضافه بهای افزایش ضعافت گلپوش بتنی پس از پرسی به اراده هر سانتی متر افزایش ضعافت نسبت به ۲ سانتی متر تا ۶ سانتی متر	مشتمل	۱۷۹۷۰.۸	۱۷۹۷۰.۸	۲۰۵۲۳.۲۳
۵۸	۲۱۰۴۰۷	اضافه بهای رنگی بدن گلپوش بتنی بیش ساخته پرسی و ویره آن	مشتمل	۱۷۹۷۰.۸	۱۷۹۷۰.۸	۲۰۵۲۳.۲۴
۵۹	۲۱۰۴۰۸	تنهه و اسراز گلپوش گرانولی محدودی و جب مخصوص	مشتمل	۹۲۶۷۴۳.۰	۹۲۶۷۴۳.۰	۲۰۵۲۳.۲۵
۶۰	۲۱۰۴۰۹	تنهه و اسراز گلپوش بتنی بیش ساخته از پتن شسته واش بتن	مشتمل	۱۲۷۱۰۷۷.۰	۱۲۷۱۰۷۷.۰	۲۰۵۲۳.۲۶

جمع اقساط بریال: ۲۰۵۲۳.۲۶

« پروژه مالی »

فهرست پهای واحد ۹۸ بهاره و شتاء این سال

کد پروژه: ۰۷

نام دستگاه اجرایی: مجموعه قیمتی باراجیس

نام پروژه: پروژه سایت پلک عسافر باراجیس

تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۱۵

نام مهندس مشاور: آرمان‌نور موسوی

کد و عنوان طرح:

ردیف #	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بررسی و تحریر	ملکدار	جمعیت برآورد
۲۲ - کارهای سنگی باستگ پلاک						
۱۰	۲۱۰۳۴	نهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گندمک تو سازیخ (لایه) ردیفهای ۱۵ تا ۲ سانتیمتر	مترمربع			۷۵۱۵۵۱۰۰
۱۱	۲۲۰۲۶۹۳	اصفهانه دوام پایه، حکمی بودن به ایتم ۲۲۰۳۰۹ به استناد بند ۵ صفحه ۱۷۳	مترمربع			۱۹۰۴۵۱۰۷
۱۲	۲۲۰۳۱۱	نهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گندمک دیزاین، دی.دی. ضخامت ۴ سانتیمتر در سطوح افقی	متر مربع			۰۷۳۶۸۶۵۱۲
۱۳	۲۲۰۴۱۷	نهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گندمک سهیسی به ضخامت ۴ سانتیمتر در سطوح افقی	مترمربع			۰۷۳۶۵۱۰۶۲
۱۴	۲۲۰۴۰۱	اصفهانه لایت و دیفیوژنی لبهه ز نسبت به پلاک سطوح افقی، غریب نظر، سکه های پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع			۰۷۳۶۵۱۳۴
۱۵	۲۲۰۴۰۷	اصفهانه پایه، نشتی، کرچن بالکنی کردن سنتیهای پلاک.	مترمربع			۰۷۳۶۵۱۰۰۰
۱۶	۲۲۰۴۰۸	گرد کردن لبه سنگ، پیو و عن، نسبه تبر (جهت) و بیچکن سکه های پلاک پس از گردانی برای هر مرزد	مترمربع			۰۷۳۶۵۱۰۷۸
۱۷	۲۲۰۸۰۳	نهیه، جعل و نصب مثولهای سنگی پلاک چشمی لاید، به ضخامت ۴ سانتیمتر به همراه اجراف، پس بقوت و بند گشی با علاوه عرضه میمان	مترمربع			۰۷۳۶۵۱۰۵۰
جمع فضی برآورد:		۲۹۸۷۸۶۵۵۱				

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه رشته ادبی سال ۹۸

کد پروژه: ۱۰۷

نام دستگاه اجرایی: مجتمعه فنی پاراجین

تاریخ: ۹۸/۰۷/۱۵

نام پروژه: بروزه ساخت پارک مسافر پاراجین

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بیانی
۲۲ - گارهای پلاستیکی و پلیمری						
۶۸	۴۳۶۰۱	نیمه و جاکتلوی غلاف پلاستیک در بن برای غور لوله و سلیم هصرف.	کیلوگرم	۴۱۹۰۰۰	۰۰۲۰۰	۸۳۹۱۶۵۰۰
		جمع فصل بیانی :				۸۳۹۱۶۵۰۰



«برگه محاسبه مقدار آجر فشاری مصرفی، هر ریوط به حمل»

فهرست بهای اینده سال ۹۸

کد پروژه: ۷۰۰

نام دستگاه اجرایی: مجموعه فنی بارگیر

نام پروژه: پروژه سایت بارک مسافر بارگیر

تاریخ: ۱۴۰۰-۰۷-۱۵

نام مهندس مشاور: آرمان‌شهر مینو

کد و عنوان طرح:

ردیت	فهرست بیان	شماره	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	خوبی	مقدار	تصوفی
۱	۱۱۰۱۰۱	آخر کاری حجمی با آخر مختاری با ملاک مسسه سینما.	مترمکعب	۱/۱۰--					۱/۱۰--	۹۱/۱۷	W/FB-
۲	۱۱۰۱۰۵	دبول بک آجر، با آخر مختاری و ملاک مسسه سینما	مترمربع	۱/۱۰--					۰/۰۷--	۱۱/۰۶	F/DFG
۳	۱۱۰۱۰۶	دبور نهم آجر، با آخر فشاری و ملاک ماسه سیمان ۱۰۵	مترمربع	۰/۰۷--	۰/۰۷--				۰/۱۲۷۵--	۱۸/۰۱	T/DAQ
		۱۱۰۱۰۷	دبور نهم آجر، با آخر فشاری و ملاک ماسه سیمان ۱۰۵	مترمربع	۰/۰۷--	۰/۰۷--			۰/۱۲۷۵--	۱۸/۰۱	A/S/VK-
			جمع آجر فشاری مصرفی :								

$$۱۱۰۱۰۷ \times (۲۰/۰۰ \text{ Km} + ۷۰/۰۰ \text{ Km}) \times ۱/۰-- = ۱۱۰۱۰۷ \text{ Km}$$

«برگه محاسبه مقدار آهن آلات مصروفی ، مربوط به حمل»

فهرست پهانی اینجا سال ۹۸

کد پروژه: ۷۰۰۰۱

تاریخ: ۱۵/۰۲/۹۸

نام دستگاه اجرایی: مجموعه فنی پاراجین

نام مهندس هنرمند: آرمانتور معتبر

نام پروژه: روزه سایت پارک مسافر پاراجین

کد و عنوان طرح:

مصرفی	مقدار	صریب	K4	K3	K2	K1	واحد	شرح مختصر ملاحظات	شماره	ردیف
									فهرست پهنا	
1/۰۵۲	۳۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۰/۰			۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	کلوگرم	جهه و اجزای آرمانی و بندی شده ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ از حداکثر	۰/۰۰۰/۰	۱
۱/۰۴۸	۱۰۰/۰۰۰	۰/۰۰۰/۰			۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	کیلوگرم	قطعات آهنی اصلی ملخص لیز از اینا مر کارهای پشتی و پلی	۰/۰۰۰/۰	۲
۰/۰۸۱	جتن اعن آلات مصروفی									

$$0/081x(۰/۰۰۰ Km - ۰/۰۰۰ Km)x V = ۰/۰۰۰/۰$$

$$0/081x(۰/۰۰۰ Km - ۰/۰۰۰ Km)x V = ۰/۰۰۰/۰$$

$$0/081x(۰/۰۰۰ Km - ۰/۰۰۰ Km)x V = ۰/۰۰۰/۰$$

$$0/081x(۰/۰۰۰ Km - ۰/۰۰۰ Km)x V = ۰/۰۰۰/۰$$

$$0/081x(۰/۰۰۰ Km - ۰/۰۰۰ Km)x V = ۰/۰۰۰/۰$$

«برگه محاسبه مقدار اساس و زیر اساس هصرفی ، مربوط به حمل»

فهرست بهاي اينه سال ۹۸

۵۵ بروزه ۷:

نام دستگاه (جزئی): مجید عده فنی پارسیان

نام بروزه: بروزه سابت بلک هاف مارینز

تاریخ: ۱۵/۰۴/۹۸

نام مهندس مشاور: آرمانشیر صینو

کد و عنوان طرح:

ردیف	شماره فهرست بها	شرح مختصر ملاحظات	مشخصات							
			تصویر	متدار	K4	K3	K2	K1	واحد	
۱	۱۶-۵-۲	آسان وودخانه می همراه T36 و روزی ۳۰-۳۵	۳۰۰۰	۳۰۰۰				T/۱۰۰	مترمکعب	
۲	۱۶-۷-۱	۳۰-۳۵ مصالح وودخانه ای (گران) چهار مترمکعب	۴۶.۷۵	۴۶.۷۵				T/۱۰۰	مترمکعب	
۳		جمعی اساس و زیر اساس هصرفی :	۱۴۵۶.۱۰							

$$1456.10 \times (T/100 - V/100 \text{ Km} + V/100 \text{ Km}) = 1456.10 \text{ Km}$$

«برگه محاسبه مقدار جدول ماشینی پرسی مصرفی ، مربوط به حمل»

فهرست پهای اینبه سال ۹۸

کد پروژه: ۷۷

نام دستگاه اجرایی: مخصوصه شی بلندی

نام پروژه: پروژه سایت پارک مسافر مازنی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

نام مهندس مشاور: آرمان پروردو

کد و عنوان طرح:

ردیف	فهرست رها	شماره	شرح مشترک علاوهات	واحد						
				K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	تصرفی
۱	۱۶۰۱۰	۱۶۰۱۰	جدول پیش ساخته مخصوص پرسی با سطح مقعر	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۶۰۱۵	۱۶۰۱۵	جدول پیش ساخته مخصوص پرسی با سطح مقعر	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۶۰۲۰	۱۶۰۲۰	جمع جدول های پیش	پرسی مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

$$16000 \times (2000 \text{ Km} \sim 1800 \text{ Km}) \times 1/100 = 400 \text{ m}^3/100$$

$$16000 \times (1800 \text{ Km} \sim 1600 \text{ Km}) \times 1/100 = 320 \text{ m}^3/100$$

$$16000 \times (1600 \text{ Km} \sim 1500 \text{ Km}) \times 1/100 = 160 \text{ m}^3/100$$

نحوی اگه معاسیمه مقدار خاک مصر فی . می بیهوده حمل «

فیلم سینمای ایران سال ۹۸

۱۰۷

نام دستگاه احیا و تغییر مقدار فرآیند

نام پروژه: پروژه سایت یارگ مسافر چارچین

تاریخ: ۲۰۱۵-۰۷-۰۸

نام مهندس، مشاور: ا. مانشیو میت

گرد و عنوان طرح:

$$V_{\text{MAP/2}}(z) = K_{\text{II}} \approx 10; K_{\text{III}}) \times 10^3 \text{ cm}^{-1} = V_{\text{MAP/2}}$$

$\text{Vmax}/Km = \text{Vmax} \cdot Km^{-1}$

$$V_{\text{MAP}}/\Delta x \left(-\phi_0 - K_m + \phi_0/K_m \right)_x V_{\text{MAP}} = \delta^2 \Gamma V_0 \phi_0$$

* برگه محاسبه علّدار شنگ قلوه مصرفی، بربوط به حمل *

شماره پیوای ایندیه سال ۹۸

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۵

نام دستگاه اجرایی: مجموعه فی براجین

نام پروژه: پروژه سایت بارک مسافر داجن

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۵

نام مهندس مشاور: رامتهر مسو

کد و عنوان طرح:

ردیف	شماره فهرست بها	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضریب	مقدار	مصرفی
۱۱	۱-۱۰۷	در راز سنت هوار و بیانی ۳-۲-۲ کم	کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۶۷/۰
۱۲	۱-۱۰۸	جمع سنت قلوه مصرفی	کیلومتر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۶۷/۰

$$۱۶۷/۰ = (۰/۰۰ Km + ۰/۰۰ Km) \times ۱/۰ = ۰/۰ Km$$

۱۶۷

۱/۰

«برگه محاسبه مقدار سنج لاشه مصرفی ، مربوط به حمل»

فهرست پهای ایندیکان ۹۸

کد یوزه: ۰۷

نام دستگاه اجرایی: «جهرمه آبی براجهی»

نام یوزه: بروزه سایت بارگ صادر برای ایندیکان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

نام مهندس مشاور: ارمغان شهر صفت

کد و عنوان صفحه:

مصرفی	منسدار	ضریب	K4	K3	K2	K1	واحد	شرح مختصر عملایق	شماره فهرست پهای	ردیف
۶۵۰/۲۱۱	۶۵۰/۲۱۱	۱/۲۸۱	۰۰			۱/۸۱۰	-	بنای دو طبقه با سکه دسته و سقف سیمانی، ۱۵۰ متر مربع	۱۳۰۵۰	۱۲
۶۵۰/۲۱۲	۶۵۰/۲۱۲	۱/۳۸۹	۰۰	۰۰	۰۰	۱/۸۱۰	-	قریبی کلی با سکه دسته و سقف سیمانی، ۱۵۰ متر مربع	۱۳۰۵۱	۱۳
۶۵۰/۲۱۳	۶۵۰/۲۱۳							بذرگانه درونی	۱۳۰۵۲	۱۴

جمع سنج لاشه مصرفی :

$$۶۵۰/۲۱۱ \times (۱/۲۸۱ \text{ Km} + ۶۵۰/۲۱۲ \text{ Km}) \times ۱/۸۱۰ = ۱۳۰۵۰\text{۸۸}$$

«برگه محاسبه مقدار سیمان مصرفی، بروزه به حمل»

فهرست بهای اینیه سال ۹۶

کد پروژه: ۰۰۷۵۰۵۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۵

نام دستگاه اجرایی: همکوه، فنی برآجین

نام مهندس مشاور: آرمان‌پور، مهندس

نام بروزه: بروزه سایت پارک مسافردار

کد و عنوان طرح:

ردیف	فهرست بها	شاره	شرح مختصر ملاحتاً	مقدار	ضریب	K4	K3	K2	K1	واحد	محرفی
۱۵	۱۸۰۱۷	پیش و پیوی ۱۵ کیلوگرم سیمان		۷۶۷۲۹	-۰/۱۳۱۰۰				۰/۰۵۰	۰/۰۱۰	۱۶۷۶۷
۱۶	۱۸۰۱۶	بلیلی دیوار یا سک لانه و ماسه سیمان ۰/۰۷۶۰۰	بلیلی دیوار یا سک لانه و ماسه سیمان ۰/۰۷۶۰۰	۱۸۷۲۷	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۷۲۷
۱۷	۱۸۰۱۵	فرش تک پاسک لانه خافت ۰/۰۷۰۰۰	فرش تک پاسک لانه خافت ۰/۰۷۰۰۰	۱۸۰۱۵	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۱۵
۱۸	۱۸۰۱۴	بنی پزی و مقاومت فشاری ۰/۰۷۰۰۰	بنی پزی و مقاومت فشاری ۰/۰۷۰۰۰	۱۷۷۲۷	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۷۲۷
۱۹	۱۸۰۱۳	بنی پزی و مقاومت فشاری ۰/۰۷۰۰۰	بنی پزی و مقاومت فشاری ۰/۰۷۰۰۰	۱۸۰۱۳	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۱۳
۲۰	۱۸۰۱۲	بنی پزی و مقاومت فشاری ۰/۰۷۰۰۰	بنی پزی و مقاومت فشاری ۰/۰۷۰۰۰	۱۸۰۱۲	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۱۲
۲۱	۱۸۰۱۱	رسقده بی معرفت سیمان مسته به قیار درج شده	رسقده بی معرفت سیمان مسته به قیار درج شده	۱۸۰۱۱	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۱۱
۲۲	۱۸۰۱۰	آخرگاری ۱۰ متر مربع	آخرگاری ۱۰ متر مربع	۱۸۰۱۰	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۱۰
۲۳	۱۸۰۰۹	دیوار یک اخر، با اخر فشاری و ملات ماسه سیمان	دیوار یک اخر، با اخر فشاری و ملات ماسه سیمان	۱۸۰۰۹	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۰۹
۲۴	۱۸۰۰۸	دووار سه آخره با اخر فشاری و ملات ماسه سیمان	دووار سه آخره با اخر فشاری و ملات ماسه سیمان	۱۸۰۰۸	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۰۸
۲۵	۱۸۰۰۷	دال پنجه بیش سانه برای تکیه ۰/۰۷۰۰۰	دال پنجه بیش سانه برای تکیه ۰/۰۷۰۰۰	۱۸۰۰۷	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۰۷
۲۶	۱۸۰۰۶	کسو گرم	کسو گرم	۱۸۰۰۶	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۰۶
۲۷	۱۸۰۰۵	کندو سیمانی ۰/۰۷۰۰۰	کندو سیمانی ۰/۰۷۰۰۰	۱۸۰۰۵	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۰۵
۲۸	۱۸۰۰۴	کندو سیمانی ۰/۰۷۰۰۰	کندو سیمانی ۰/۰۷۰۰۰	۱۸۰۰۴	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۰۴
۲۹	۱۸۰۰۳	کندو سیمانی ۰/۰۷۰۰۰	کندو سیمانی ۰/۰۷۰۰۰	۱۸۰۰۳	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۰۳
۳۰	۱۸۰۰۲	کندو سیمانی ۰/۰۷۰۰۰	کندو سیمانی ۰/۰۷۰۰۰	۱۸۰۰۲	-۰/۰۷۰۰۰		۰/۰۶۰	۰/۰۶۰	-۰/۰۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۰۲
۳۱	۱۸۰۰۱	قطع	قطع	۱/۱۰	-۰/۰۰۰۲۷۰	۰/۰۷۰۰۰			۰/۰۷۰۰۰	-۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۰۱
۳۲	۱۸۰۰۰	دریوپ وری ۰/۰۷۰۰۰	دریوپ وری ۰/۰۷۰۰۰	۱/۷۶۴	-۰/۰۱۷۰۰۰	۰/۰۷۰۰۰			۰/۰۷۰۰۰	-۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۰۰
۳۳	۱۸۰۰۹	ستگشی طای سنگ، پاسک لانه و ملت سیمان	ستگشی طای سنگ، پاسک لانه و ملت سیمان	۱۸۰۰۹	-۰/۰۰۰۱۶۳۱	۰/۰۷۰۰۰	-۰/۰۷۰۰۰	-۰/۰۷۰۰۰	-۰/۰۷۰۰۰	-۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۰۹
۳۴	۱۸۰۰۸	سنگ هلاکت همراهی ۰/۰۷۰۰۰	سنگ هلاکت همراهی ۰/۰۷۰۰۰	۱۸۰۰۸	-۰/۰۰۰۱۶۳۲	۰/۰۷۰۰۰	-۰/۰۷۰۰۰	-۰/۰۷۰۰۰	-۰/۰۷۰۰۰	-۰/۰۷۰۰۰	۱۷۰۰۸

جمع سیمان مصرفی:

$$۱۸۰۰۰\text{Km} \times (۰/۰۷۰۰۰\text{Km} + ۰/۰۷۰۰۰\text{Km}) = ۰/۲۱۷۷/۵$$

«برگه محاسبه مقدار سُن و ماسد سیرغی، سربوچ بده جمل»

فهرست پهای اینیه سال ۹۸

۷۰

نام دستگاه اجرایی: مجموعه فنی پارچین

نظام پروژه: میروره سایت یوک مسائچ یاوه جین

٩٨٥، ٤/١٥: تاریخ

لایم یونیورسیتی، مشاوره ایمنی

کد، عنوان، طرح:

$$V_{\text{D}\Delta}/V_{\text{D}\Delta}^{\text{ex}} = (T_{\text{c}}/\Delta \cdot K_{\text{m}} + T_{\text{c}}/\Delta \cdot K_{\text{m}})^{\text{ex}} / (T_{\text{c}}/\Delta \cdot K_{\text{m}})$$

برگه محاسبه مقدار مصالح تخریبی صرفی - مربوط به حمل *

فهرست بهای اینت سال ۹۷

کد پروژه : ۰۷۰۷
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۵/۹۸

نام دستگاه اجرایی : محمویه لی بارخین
نام مهندس عشاور : آرمان شهر نیا

نام پروژه : بروزه سایت بارک مسافر بر این
کد و عنوان طرح :

ردیف	فهرست بهای	شماره	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	خوبی	مقدار	صرفی
۳۰	۱۰۶۰۳	۱۰۶۰۳	تخریب های آخري . سکی و لات مایه ... دل بارخین	مترمتر	۱۰۰۰				۱۰۰۰	۱۲۷۸۰	۱۲۷۸۰
۳۱	۱۰۶۰۴	۱۰۶۰۴	تخریب پشت، بد مسلح با هر عیار سینه	مترمتر	۱۰۰۰				۱۰۰۰	۷۷۵۰	۷۷۵۰
۳۲	۱۰۶۰۶	۱۰۶۰۶	ضریب بتن مبلل راه های راهنمایی و ملکه	سریع	۱۰۰۰				۱۰۰۰	۱۲۷۸۵	۱۲۷۸۵
۳۳	۱۰۶۱۴	۱۰۶۱۴	تخریب و مرداشتن اسلافل بین دو خط پوشش ده شاخه است	مترمتر	۱۰۰۰				۱۰۰۰	۱۷۵۰۰	۱۷۵۰۰
جمع مصالح تخریبی صرفی											
۱۰۶۰۳ (Km ~ ۰/۱ Km) x ۱۰۰۰ = ۱۰۶۰۳											
۱۰۶۰۴ (۰/۱ Km ~ ۰/۵ Km) x ۱۰۰۰ = ۱۰۶۰۴											
۱۰۶۰۶ (۰/۵ Km ~ ۰/۱ Km) x ۱۰۰۰ = ۱۰۶۰۶											

«برگه محاسبه مقدار آهن الات مصرفی ، مربوط به حمل»

فهرست بهای راه، راه آهن و پاند فرودگاه سال ۹۸

کد پروژه: ۰۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵

نام دستگاه اجرایی: مجموعه فنی بار جیم

نام مهندس مشاور: آرمانشهر منو

نام پروژه: پروژه ساخت پارک صافر پارچین

کد و عنوان طرح:

ردیف	شماره فهرست پیما	شرح مختصر ملاحظات	واحد	K1	K2	K3	K4	ضريب	مقدار	تصرفی
۱۰۰۱	۴۱	A۲ آنورندی ۲ سرمه آذجبار	کلوگرم	۱۰-۵۰۰	۱۰-۵۰۰			۰-۰۰۱	۰-۰۰۱	-۰-۳۰
۱۰۰۲	۶۰	بوق آر سیلکردن با پنج و سه	کلوگرم	۱۰-۵۰۰	۱۰-۵۰۰			۰-۰۰۱	۰-۰۰۱	-۰-۲۸
		جمع آهن کلن مصرفی:								-۰-۸۷

$$-۰-۸۷ \times (۲۰-۰۰ \text{ Km} + ۵۰-۰۰ \text{ Km}) \times ۰-۰- = ۷-۰-۶$$

$$-۰-۸۷ \times (۵۰-۰۰ \text{ Km} - ۱۰-۰- \text{ Km}) \times ۰-۰- = ۴-۰-۷$$

$$-۰-۸۷ \times (۱۰-۰- \text{ Km} + ۱۵-۰- \text{ Km}) \times ۰-۰- = ۱-۰-۷$$

برگه محاسبه مقدار سیمان مصرفی ، مربوط به حمله

طبرست بهای راه آهن و پاند فرودگاه سال ۹۸

کد بروزه: ۰۰۷

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

نام بروزه: بروزه سایت پرک مسازی باواجین

نام دستگاه اجرایی: مجموعه فنی برایجین

نام مهندس مشاور: ارمانتیکر مینو

کد و عنوان طرح:

مصرفی	مقدار	ضریب	K4	K3	K2	K1	واحد	شرح مختصر ملاحظات	شماره طبرست بهای	ردیف
-۳۷۴۷	۱۷.۵	-۰.۳۷۱۰۰			۰.۴۰۰	۰.۲۵۰۰	مترمکعب		۱۴۱۰۰۱	۰۶
-۳۷۴۷	جمع سیمان مصرفی:									

$$-۰.۳۷۱۰۰ \times (-۰.۴۰۰ + ۰.۲۵۰۰) = ۱۷.۷۵$$

جدول (الف): مبلغ و خرایب بیشنهادی جزء برای هر فصل

موضوع پروژه: پروژه سایت پارک مسافر پارچین

رشته: آباد

محل اجرا:

فهرست بهای واحد پایه سال: ۹۸

مبالغ به روبل

فصل	عنوان فصول	برآورد فصل پس از اعمال تعامی خرایب	برآورد فصل [اقلام پایه و شعبهای]	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تعامی خرایب و هزینه های حوره نظر	فسریب بیشنهادی جزء
۱	عملیات فخریب	۵۶۲۸۰۵۷۵	۸۱۷۷۴۲۷۹		
۲	عملیات خاکی با هاشین	۲۰۷۳۲۳۲۸۷	۲۰۷۱۱۰۰۲۷۸		
۳	عملیات یتلی با سست	۱۰۳۷۷۹۹۶۰۱۰	۱۰۳۷۷۹۹۶۰۱۰	۱۰۳۷۷۹۹۶۰۱۰	
۴	قابب جندی فولادی	۹۱۶۷۹۷۸۱	۲۲۳۱۲۱۰۵۰۲		
۵	کارهای غولادی پ. میلکرد	۱۱۱۶۵۱۰۵۲	۱۷۸۲۶۵۰۱۷		
۶	پتن درجا	۴۷۰۹۹۲۰۹۶۲	۴۸۴۰۸۰۹۴۰		
۷	کارهای فولادی سنگین	۸۱۰۵۸۷۲۴۰	۱۱۸۴۸۹۰۲۹۶		
۸	آجرگیری و سفله رمزی	۶۷۱۰۷۳۰۶۰۰	۲۹۴۲۶۲۰۲۵۰		
۹	پتن پیش ساخته و بلوك جیس	۷۴۸۰۴۰۰۹۵۰	۱۱۵۹۰۰۷۷۰		
۱۰	عایق کازی رطوبتی	۰۷۲۲۹۰۰۰	۱۰۴۶۲۹۰۲۷		
۱۱	کارهای فولادی سبک	۷۱۰۷۲۶۰۸۰۷	۱۱۵۷۸۷۰۲۱۴		
۱۲	تدوکاری و پندکتسی	۱۰۵۰۵۰۲۱۵۴۹	۲۲۱۰۷۶۲۰۶۲۱		
۱۳	غوش مواریک و تقویش پتنی	۸۶۲۰۸۵۶۹۳۶	۱۲۴۰۱۱۷۰۱۲۲		
۱۴	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۲۶۸۰۷۴۶۰۵۵۲	۰۵۰۰۳۲۰۹۱۷		
۱۵	کارهای پلاستیکی و پلیمری	۴۶۰۰۲۸۰۰۰	۸۰۱۰۱۰۵۰۳۷۹		
۱۶	رنگ امیزی	۵۰۰۶۰۱۰	۷۲۵۰۰۱۴۰		
۱۷	زیراساس و اسلی	۲۸۲۰۰۱۰۲۳	۴۱۰۰۹۱۵۰۵۷۸		
۱۸	حمل و نقل	۲۷۸۰۴۲۰۰۵	۴۰۴۰۳۵۶۷۰۲		
جمع		۵۰۰۶۵۷۷۶۳۵	۷۱۹۲۴۰۵۸۷۶۹۹		

جدول (الف) مبلغ و ضرائب پیشنهادی جزء برای هر فصل

موضوع پروژه: پروژه سینمایی پارک مسافر با اجنبی

رسانه: راه راه آهن و باند فرودگاه

فهرست بهای واحد پایه سال: ۹۸

مبلغ به ريال

فصل	عنوان فصول	پرآورده فصل (اللام پایه و غیرپایه)	پرآورده فصل پس از احتساب نهادی ضرائب و اعمال تعامی ضرائب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب نهادی ضرائب و هزینه های مورد نظر	ضرائب پیشنهادی جزء
۱	اگر های فولادی با میلکره	۱۰۴۰۷۵۶	۶۲۷۹۶۱۴		
۱۳	بنی پیش ساخته	۷۷۷۴۳۶	۵۵۸۸۲۸۴		
جمع		۸۰۱۶۲۱۲	۱۱۸۸۸۲۹۸		

تاریخ : ۱۳۹۷/۴/۱۵

جدول (ب) : مبلغ پیشنهادی جزء تجهیز و بروجیدن کارگاه

محل اجرا :

پروژه : پروژه سایت یارگ مسافر برای خان

کد پروژه : ۰۰۷

فهرست بهای واحد پایه سالی : ۹۸

عنوان	مبلغ برآورد تجهیز و بروجیدن کارگاه	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با اختساب تمامی ضوابط و مزینه های مورده نظر	خریب پیشنهادی جزء
تجهیز و بروجیدن کارگاه	۲۸۱۰۰۰۰۰		

جدول (پ) : مبلغ پیشنهادی برای هر رشتہ ، تجهیز و برجیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل

بروزه : پروژه ساخت یارک مساقط باراجین

کد پروژه : ۰۰۷

تاریخ : ۹۸/۰۲/۱۵

محل اجرا :

-بالغ به دیال-

ضریب پیشنهادی کل	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های موردنظر	مبلغ رشتہ پس از اعمال تمامی ضرایب	عنوان	ردیفه
		۷۹۲۴۵۸۷۷۰۰	۱	باند
		۱۳۸۶۸۱۷۴۸	۲	براد، راه عرض و باند فرودگاه
		۲۸۱۰۰۰۰۰۰		تجهیز و برجیدن کارگاه بطور مقطوع
		۸۱۲۱۷۱۴۵۵۰۹۹۸		جمع

جدول ۱- ردیفهای مورد استفاده در فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها

(۱)

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

موضوع کار: پروژه ساخت پارک مسافر بار جین

کد پروژه: ۱۷۰۵

نام دستگاه اجرایی: مجموعه فنی راججن

تاریخ: ۹۷/۷/۱۵

نام مهندس مشاور: آرماتیشن میندو

کد و عنوان طرح:

مبلغ به ریال

ردیف	بهای کل ردیف	شرح مختصر ردیف	شماره ردیف	عنوان فعل	شماره	فهرست بهای زدن...
۱	۶۰۰۰۲	هزار خوش لک سانگ لایه، بخش امت منو ۱۰۰-۲۷۶۰۰-۷۸۴۰	۶۰۰۰۲	عسان می سی سی سی	۱	اند
۲	۳۰۰۰۵	تیره مصالح حمل و احراری کپوش خان شی پیش ساخته بوسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی متریز برای هر کفپوش ۱۵ سانتی متر مامسه نرم زیر آن و دو غل نیزی	۳۰۰۰۵	فرم بورلیک و کپوش پنی	۲	ابده
۳	۲۱۰۰۵*	تیله و اجری کپوش گرانولی معمولی با جسب اسخصوص	۲۱۰۰۵*	آرمان بورلیک و کپوش پنی	۳	ابده
۴	۱۶۰۰۲	زینه، ساخت و نصب صفات پنی پیش مانشه بواری تیله گاه لد، pipe sleeper، گلهای مشابه با عوارض ۲۰ کیلو گرم سیمان در مت مکعب اتن	۱۶۰۰۲	زن پنی - خاکه رارک، جی	۴	ابده
۵	۱۱۰۰۷	زینه مصالح حمل و احراری کپوش های پنی پیش ساخته بوسی، به ضخامت ۴ تا ۵ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی متریز برای هر کپوش، با هر روز ملاس، نرم سیمان	۱۱۰۰۷	زن پنی - خاکه رارک، جی	۵	ابده
۶	۵۰۰۰۷	سی سی سی سک لایه و ملات مامه سیمن ۱۵ در دبورها و پیر محل (خانی که بالاتر از بیش از خاره طرف)	۵۰۰۰۷	عملیات سایی سانگ	۶	بده
۷	۲۰۰۰۱	حمل و نقل	۲۰۰۰۱	حمل و نقل	۷	بنده
۸	۰۰۰۰۶	بنچ درجا	۰۰۰۰۶	بنچ درجا	۸	ابده
۹	۲۶۰۰۱۰	گارهای سانگی سانگ بلک	۲۶۰۰۱۰	گارهای سانگی سانگ بلک	۹	اند
۱۰	۰۷۰۰۵	کارهای فولادی سابلکره	۰۷۰۰۵	کارهای فولادی سابلکره	۱۰	ابده
۱۱	۱۶۰۰۲	ذرا رس و اسان	۱۶۰۰۲	ذرا رس و اسان	۱۱	ابده
۱۲	۱۱۰۰۱	اجرکاری و شفته ریزی	۱۱۰۰۱	اجرکاری و شفته ریزی	۱۲	ابده
۱۳	۱۱۰۰۹	اجرکاری و شفته ریزی	۱۱۰۰۹	اجرکاری و شفته ریزی	۱۳	بنده
۱۴	۰۸۰۰۲	بنچ درجا	۰۸۰۰۲	بنچ درجا	۱۴	بنده

توضیح: بهای واحد ردیفها با اختصار، فرایب فهمت بها، بجز ضرب بالاسری و هزینه تجهیز و برجیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای مهندس مشاور

مهر و امضای مهندس مشاور

جدول ۱. ردیفهای مورد استفاده در فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها

موضوع کار: پروژه ساخت بارگاه صافی راهنم
نام دستگاه اجرایی: مجتمعه فنی، راهنم
تاریخ: ۹۸/۰۴/۱۵
نام مهندسین مشاور: آرمانشیر هبتو
کد و عنوان طرح:

برای اینجا

ردیف	بهای کل	شرح مختصر ردیف	شماره ردیف	عنوان فصل	شماره	فهرست بهای رشته
۱۵	۶۴۷۴۳۶۴۶	نیمه مصالح بودخانه لبی (وونان) برآمده حکم بستر را و سجره، بالاجای نشر غشی در راه سازی راه راهنم	۷۶۰۷۰۱	ترکیبات و نشان		ابهه
۱۶	۸۷۰۴۹۵۶	نهیه و ساخت خطاب اهتمامی و نصب در داخل	۷۹۰۷۰۱	کارهای فولادی سنتی		ابهه
۱۷	۷۹۵۴۴۴۸۰	نهیه و جعبه چوبی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن‌بزی مدتی جدول، کاشت‌بزی و شیکر و تخلیه	۸۰۰۱۰۲	قالب چوبی فولادی		ابهه
۱۸	۷۸۰۷۹۶۲۸	نهیه و جعبه چوبی بتنی ساخته بوسی، با سطح منطبق تا ۰.۷۶ متر بین و با حداقل مقاومت استوانه ای استاندارد ۱۲۰ کیلوگرم بر متر مربع.	۹۶۰۱۰۱	پن پیش ساخته و بتوک چوبی		ابهه
۱۹	۷۷۰۷۱۱۷۹۰	نهیه سیمانی داماد مسدس بیمان ۱۰ به مختار خودی آلاتیست، روی سطوح فرعی	۱۰۰۳۰۱	اسهادگاری و نهادگار		ابهه
۲۰	۷۶۰۷۵۷۵۰	نهیه و اجرای سفن با شدن و ملاده نسبتاً غلبه‌ی با شکسته، با مقاومت فشاری بسحده ۱۵ متابارکن	۱۰۰۱۰۱	اتن درجا		ابهه
۲۱	۷۵۰۶۸۷۶۵۶	نهیه و درب خودولهای بسته شده بوسی، با سطح منطبق بین ۰.۷۶ و ۰.۷۸ متر بین و با حداقل مقاومت استوانه ای استاندارد ۱۲۰ کیلوگرم بر متر مربع.	۱۱۰۱۰۵	پن پیش ساخته و بلوك چوبی		ابهه
۲۲	۷۱۰۵۷۲۱۵	نهیه و ساخت فالبینی با استفاده از قالب فولادی دریخانه و نهادگاری	۱۲۰۱۰۱	قالب سنتی فولادی		ابهه
۲۳	۶۵۰۸۳۳۱۱۵	برآمد مصالح رسانخن غرب پوش، روز، دنیول (یک حرفه با بوذرجه، گفت‌بهوده (داخل با خارج)، تعمیه آب جذاب، در ابساط و فالبینی، با ملات ماسه سیمان ۱۰)	۱۴۰۷۰۱	الدوادگاری و نهادگار		ابهه
۲۴	۶۴۰۶۶۴۴۲۰	اصاله بهای فرازش خذالت کذب‌شون، پیش ساخته بوسی به لایه هر سانتی ستر افزایش خذامت قیمت به ۳ سانتی متر با ۸ سانتی متر	۱۵۰۱۰۵	فرش مراییک و کنبوش بتی		ابهه
۲۵	۶۱۰۱۷۵۱۱	عملیات حملی با مادری، که فصله حمل بین از ۵۰۰ متر تا ۱ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر میاراد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه علای استانی (کسر کبوتر) به نسبت هیئت یک کیلوگرم محاسبه می‌شود	۱۶۰۷۰۲	عملیات حملی با مادری		ابهه

توضیح: بهای واحد ردیفها با اختصار شراب میراث بهای جزو خوب بالا و میراث بهای نیز و برجستن گارگاه می‌باشد.

میراث امنی مهندس مشاور

میراث امنی مهندس مشاور

جدول ۱. ردیفهای مورداستفاده در فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها

کد پروژه: ۰۷۵۴۰۷۰۰۰

نام دستگاه ایرانی: مجتمعه ثبت، داراجین

موضوع کار: پروژه ساخت پارک مسافر بارجین

تاریخ: ۹۸/۰۴/۱۵

نام مهندس مشاور: آستانه شهر صبو

کد و عنوان طرح:

صیغه: رده

ردیف	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح مختصه ردیف	ردیف	بهای کل ردیف
۲۶	عملیات حاکی و ماضی	۰۳۰۲۰۱	الگری مواد حصل از عملیات خاکی یا خاکهای برجهای و حمل آن با کلپون ماغنتی و سلسه کارکردهای گردن از اینکه ۱۰۰ متری هر گز تغلیق شود	۵۶۷۶۰۳۰۶	۵۶۷۶۰۳۰۶
۲۷	بنجن درجا	۰۵۰۱۰۲	چهارهای و جزای شن ماسنی و عالیه شسته طبیعی به گردیده، از قوایت فشاری مشتمله ۲۰ مگاباری	۵۶۷۶۰۴۰۵۶۹	۵۶۷۶۰۴۰۵۶۹
۲۸	کارهای سنگی با سنجک پلاک	۰۲۰۲۰۶	تهیه و نصب سنگ پلاک همراهی گندمک صیقلی به ضخامت ۳ سانتیمتر در سطوح افقی	۹۸۵۶۹۱۰۹	۹۸۵۶۹۱۰۹
۲۹	کارهایی با اسنکنکی راهبردی	۰۲۱۰۰۱	تهیه و جذب ری غلاف پنداشتکی در بنجن برای عبور آبود و سیره ادارف	۹۸۱۳۵۸۲۰	۹۸۱۳۵۸۲۰
۳۰	کارهایی سنگی با سنجک پلاک	۰۲۰۸۰۳	تهیه، حمل و نصب متنبزهای سنگی با سنت جیبی لایبید، به ضخامت ۳ سانتی متر به همراه اجرای بنن مقویت و پند کشی با ملات ماسه سیمان	۴۲۱۲۵۷۲۲۰	۴۲۱۲۵۷۲۲۰
۳۱	عملیات پنایر با سنجک	۰۴۰۱۰۳	دزدگ و پری پشت پنایر از زیر هد (درناز) با سنجک قابو	۳۹۳۷۸۱۵۷۴	۳۹۳۷۸۱۵۷۴
۳۲	کارهایی سنگی با سنجک پلاک	۰۲۰۲۰۹	تهیه و نصب سنگ پلاک همراهی گندمک در سطوح اعضی به ضخامت ۱۰ مم مانند	۵۷۰۰۰۰۰۵۲	۵۷۰۰۰۰۰۵۲
۳۳	عملیات حاکی با ماده ای	۰۳۰۱۰۱	تهیه، ساخت، نصب پلکانی، لایه ای، پلکانی، پلکانی، شامل کنده، پرگیری و حمل، تا تعلیم ۵۰۰ متر و بارگذاری خر محل مفتر	۳۵۰۰۰۰۰۵۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۵۰۰
۳۴	کارهایی فولادی سنجک	۰۱۰۱۰۵	تهیه، ساخت و نصب حفاظات نزدیک و نزدیکان، نایپرسی فری کف به های زونه ماسه و بروپلیمه، تو خالی، احا سازی و دستگرد نصب برای الات همراهی چوشکاری و سایبان نازم	۳۵۰۰۰۰۰۵۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۵۰۰
۳۵	تصنیفت سنجک	۰۱۰۱۰۶	نحوی پهن منبع، با هر عیار سیمان و میزین میز، گزنه	۳۶۰۷۸۰۸۳۸	۳۶۰۷۸۰۸۳۸
۳۶	کارهایی فولادی سنجک	۰۱۰۱۰۷	تهیه، ساخت و نصب حفاظات، نزدیک و نزدیکان و فاصله ای فری کف سهه از نسی، سیبری، ناودی و حملکره پری و مانند آن، با جالزی و دستگرد حب برقی اکلت همراه با جوشکاری و سایبان لازم	۳۰۰۱۷۸۰۸۴۸	۳۰۰۱۷۸۰۸۴۸
۳۷	زیر اسماں و اساس	۰۲۰۱۰۱	معنی، آب پاشی، تصفیه و کوئیزین اشاره ای اساس به ضخامت ۱۰ سانتیمتر، با حداقل ۱۰۰ درجه ترماکر به روی اشواخ اراضی	۰۲۰۵۷۴۰۱۶	۰۲۰۵۷۴۰۱۶
۳۸	عمیقات بنایی با سنجک	۰۴۰۲۰۲	اضافه، پا بزرگ، های بنایی با سنجک لائمه، برای نمایزی با سنجک پادر	۷۵۰۵۶۸۱۶۳	۷۵۰۵۶۸۱۶۳

توضیح: بهای واحد ردیفها با حدیث ابضر ای، غیر ای، زد ای، بحر ضرب، بالا ای و تریه تعیین و برجستن کارگاه می باشد.

میر و امضا مهندس مشاور

صفحه: ۳

جدول ۱-ردیفهای مورد داشتاده در فیلم مورد عمل به قریب نزولی بهای کل ردیفها

کد پروژه: ۷۰۰۰۷

نام دستگاه اجرایی؛ مجدویه قمی (لارجین)
قام مهندس مشاور: ارمانتشو میتو

موضع کار؛ روزه سیستم پارک سافر با راجین کد و عنوان ملحوظ:

گد و عنوان ملجم

مبالغہ ریال

ردیف	عنوان فصل	شماره و ترتیب	شرح مختصر ردیف	ردیف	عنوان	شماره
۲۶	زنجیرسازی و ایمان	۷۶-۶-۱	وینچ آن پاپتی، سطحیج و کوبیدن فشرهای بزرگ اسلس به ضخامت نا ۱۵ سانتیمتر، با حلقه ۹۵ درصد فراکم به روش اشواصلانی.	۵۲۵۵۰۵۲۶	وینچ آن پاپتی، سطحیج و کوبیدن فشرهای بزرگ اسلس به ضخامت نا ۱۵ سانتیمتر، با حلقه ۹۵ درصد فراکم به روش اشواصلانی.	۳۲
۲۷	فرش موزایک و کنیوال دسته	۱۰۰-۴-۸	لذت به رای رنگی بودن کهروش بتنی پیش ساخته درستی و پردازه ای.	۶۱۹۴۷۶۹۹۱	لذت به رای رنگی بودن کهروش بتنی پیش ساخته درستی و پردازه ای.	۲۰
۲۸	جهل و نظر	۲۸۰-۱-۱	حمل آهن الات و سیمان باکنی، سبب به مازاد بر ۳۰ کیلوگرم نا غاصمه ۷۵ کیلوگرم.	۲۰۱۸۷۷۶۶۷	حمل آهن الات و سیمان باکنی، سبب به مازاد بر ۳۰ کیلوگرم نا غاصمه ۷۵ کیلوگرم.	۲۹
۲۹	کارهای سنتکی با سلگ و پلاک	۱۶۰-۳-۱۰۷	کارهای سنتکی با سلگ و پلاک.	۱۰۰۱۶۷۵۶۷	کارهای سنتکی با سلگ و پلاک.	۲۱
۳۰	بن پیش ساخته و بلوك جیبی	۱۲۰-۹-۶۴	اضافه به رنگی بودن گنیوش بتنی پیش ساخته بروسی.	۱۸۰۸۸۰۲۱۰	اضافه به رنگی بودن گنیوش بتنی پیش ساخته بروسی.	۴۲
۳۱	عمدات حکمی با مالین	۳۰۰-۷-۶	حدن مواد حاصل از عملیات خاکی یا حاکهای توده بند، هفی گه ناصله حمل پیش از ۱۰۰ متر با دقیق ناند. از این مر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول. کمتر ۱۰۰ متر به نسبت محاسبه می شود.	۱۸۰۱۲۸۰۸۸	حدن مواد حاصل از عملیات خاکی یا حاکهای توده بند، هفی گه ناصله حمل پیش از ۱۰۰ متر با دقیق ناند. از این مر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول. کمتر ۱۰۰ متر به نسبت محاسبه می شود.	۴۳
۳۲	کارهای سنتکی با سلگ پلاک	۲۰۰-۶-۷	لذت به رای قیمتیابی کردن پ کلنجی کردن سلکهای پلاک.	۱۶۰۰۶۹۱۶	لذت به رای قیمتیابی کردن پ کلنجی کردن سلکهای پلاک.	۴۴
۳۳	اندوگری و سندکتی	۱۸۰-۸-۶	بند گشی حای سنتکی ناستک لامه و ملات ماسه سیمان ۱۵.	۱۵۰۱۷۶۰۳۶۲	بند گشی حای سنتکی ناستک لامه و ملات ماسه سیمان ۱۵.	۴۵
۳۴	کارهای فولادی سپک	۱۶۰-۶-۹	تجویز، ساخت و نصب ۲۵ پرده، دریش دا و کف سازی حای فولادی سا و روی ساده یا آجدار، همراه با سروی، تیشی، نسد و سیم پروفیل های لازم یا جوشکاری و سالمدن.	۱۲۰۷۶۶۰۸۶۶	تجویز، ساخت و نصب ۲۵ پرده، دریش دا و کف سازی حای فولادی سا و روی ساده یا آجدار، همراه با سروی، تیشی، نسد و سیم پروفیل های لازم یا جوشکاری و سالمدن.	۴۶
۳۵	اچ کری و شفت روی	۱۶۰-۷-۵	دیوار یک آجره یا آخر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱۵.	۱۲۰۲۵۷۰۰۰	دیوار یک آجره یا آخر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱۵.	۴۷
۳۶	عینیت خاکی با مالین	۳۰۰-۹-۳	پیش اب پاشی، سطحیج، پر عیله کومن، رکلا و کوبیدن فشرهای خاکبریزی و توکان، با ۹۵ درصد تغییدگر پیرون آنچه نمایان، وقتی که ضخامت خاکهای خاکبریزی سیم / کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد.	۱۲۰۱۶۸۰۲۲	پیش اب پاشی، سطحیج، پر عیله کومن، رکلا و کوبیدن فشرهای خاکبریزی و توکان، با ۹۵ درصد تغییدگر پیرون آنچه نمایان، وقتی که ضخامت خاکهای خاکبریزی سیم / کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد.	۴۸
۳۷	عینیت خاکی با مالین	۳۰۰-۱-۱۳	وسیله مکننی، حمل مواد حاصل از حاکبریزی داری نا فائله ۲۰ متر از مرکز قفل بودشت و توده کردن آن.	۱۲۰۶۴۰۴۸۵	وسیله مکننی، حمل مواد حاصل از حاکبریزی داری نا فائله ۲۰ متر از مرکز قفل بودشت و توده کردن آن.	۴۹
۳۸	عملیات بسانی با سنتک	۱۶۰-۳-۶	نسبت درز تقاطع غیر متعارفی های سنتک با تمام عصات لازم و بعمر شکل.	۱۱۰۲۸۰۱۰۷	نسبت درز تقاطع غیر متعارفی های سنتک با تمام عصات لازم و بعمر شکل.	۵۰
۳۹	نمود و نقل	۲۸۰-۱-۱۲	عینیت آهن الات و سیمان باکنی، سبب به مازاد بر ۲۴ کیلوگرم نا غاصمه ۱۵ کیلوگرم.	۱۰۰۰۹۳۰۰۲	عینیت آهن الات و سیمان باکنی، سبب به مازاد بر ۲۴ کیلوگرم نا غاصمه ۱۵ کیلوگرم.	۵۱

لهم اقض عذابنا واجعلنا من اهلكن حسنة واجعلنا من اهلكن حسنة

من و اصلی محتوا

جدول ۱. ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا غیرهست عای مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها

کد پروژه: ۰۰۷

نام دستگاه اجرایی: مجتمعه فنی باراحسن

موضوع کلار: هرزوگ سایت پرداز، آذار بازجیون

تاریخ: ۹۸/۰۶/۱۵

نام مهندس مشاور: ارشیدر مینو

کد و عنوان طرح:

سالخواه دهال

ردیف	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح مختصر ردیف	بهای کل ردیف
۵۳	عملیات تراکی با ماشین	۱۶۱۰۴	پخش چاکری سائی ریسه ثابت تنظیم و کلکران	۱۶۶۹۶۹
۵۴	عایق تکاری و میانبر	۱۶۰۲۴	عاق کاری رطوبتی، با عایق پوش ساخته فرخه بک متخلک از قیر بلندیکر، لایق باقی مفتر نوع نایفه و تیشو بد ناخاپ ۵۷ نا ۴ میانی متر به انعام فشر آسر برای سیر سفلوح	۱۶۷۰۵۷
۵۵	عملیات تخریب	۱۰۰۴۵	آخرب، ایاع شیملچ، پلر جلر سیمان	۸۷۸۹۱۳
۵۶	سلنانه تخریب	۱۰۰۲۱	تخریب کلی ساختهای آبرو، سیگی و بلوکی نا رلاتیون مخمله، شامل تمام عملات تخریب	۶۶۵۸۲۵
۵۷	فرش موادیت و تکبیش پوش	۲۱۰۶۷	نیمه و جرا، تکبیش پوش ساخته زین	۶۶۳۶۹
۵۸	زنگ از	۰۰۰۳۱	ابنکه پایه ردیفهای پهن بزرگ، تو صورت معرف پهن و پهن منح	۰۸۰۷۹۸۴
۵۹	تن درج	۰۸۰۳۹	نصف پهله ردیفهای پهن بزرگ، هر تکه ساخته، پهن ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۸۰۳۹
۶۰	جزئی و سند بزرگ	۱۱۰۷۸	دور روم احمد سایر فندی و علات ماسه سیمان	۱۱۰۷۷۶
۶۱	تن درج	۰۰۰۴۱	غافه به برای مصرف سیمان لرزانی، تسبیت به عبار درج شده در ردیف های منوط	۳۱۶۸۱۰۵۱
۶۲	بن پیش ساخته	۱۳۱۰۱	نیمه و نصف طوکمیت هنی جدا کنند، تراپلک (فروزنوس پارپاره، با بتن و عبار ۷۰-۷۵ کلوگرم سیمان در همو مذکوب پنهان	۳۱۶۵۳۱۰۵۲
۶۳	عملیات خگی با ماشین	۰۰۰۵۱	ت پوشو، توبیز پسر خاتم پرها یا لذت توانش ها و منته آنده تا عمق ۱۵ سانتیمتر با رکم ۹۵ درصد سروشی آشواخی	۳۱۶۵۱۱۲۶
۶۴	عایقین، تکبیس	۰۰۰۴۰	نگوبی پایی عای خرس، بلوکی و سینکی که ماملاط در سیمان، یا راتر، چونه متد بالشد	۳۱۶۷۱۰۷
۶۵	عملیات پلیسی به سیگ	۰۰۰۵۱	نیمه صالح زهکن، طبق سلخصت و به کامرون ای در چندینها	۳۱۶۸۱۰۵۲
۶۶	رنگ، آبرنی	۰۰۰۵۰	جهجه مصالح و احرار خط کشی منقطع و منهوب به عرض ۱۲ سانتیمتر، پرنگهدی، فراهمی سرمه	۳۱۶۷۰۱۵۰
۶۷	عملیات تخریب	۱۶۰۴۷	برش آغازالت با گازر به عمق ۱۰ سانتیمتر (لندره)	۳۱۶۷۳۰۰۰
۶۸	اندوکاری و سندکنی	۱۶۰۳۰	کندو، بینه ای به فتحهای حدود ۲-۳ تی پتو روی سطوح قائم، با علات ماسه سیمان	۳۱۶۷۳۰۰

نویسی بهای واحد ردیفها با اختساب مصائب نهاده است. بهای هر جزء در اسراری و غیره، بجز و بجز و بجزین کار نکه می شود.

میر و امدادی مهندس مشاور

میر و امدادی مهندس مشاور

جدول ۱. دیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی پهای کل دیفها

کد پروژه: ۰۰۴

نام دستگاه اجرایی: مجتمعه آن ارجمند

موضوع کار: بروزه سایت پارک مسافر مراجعت

تاریخ: ۹۸/۴/۱۵

نام سهندس ستاور: آرماسیو مینز

کد و عنوان طرح:

مبالغه به زبان

شماره	فهرست پهای رشته	عنوان فعل	شماره دیف	شرح ساخت دیف	پهای کل دیف
۶۹	رف، راه آهن و باند فریده	کالاهای فولادی با میکرتو	۰۹۰۵۰۳	تیهی، ساخت و تنصیب میله مهار شده شده (بولت) از هر نوع سل. گرد، با پیچ و پیوه مربوط و کار گذاری در محلاتی لازم، غلیل از بن ریزی	۳۲۲۰۷۶۱
۷۰	ابهیه	کالاهای سیکری باستگی بلاک	۰۶۰۶۰۸	تریکردن قبه سنتگ، بین زدن تعیین شده (جعبه) آچکان - گل خانی بلاک بجز گرانیت برآورده موردن	۴۶۷۳۰۳۰
۷۱	ابهیه	کالاهای سیکری باستگی بلاک	۰۶۰۶۰۹	اثر قیمه دستی به دیفهای تیهیه و انسان سنتگ، بلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنتگهای بلاک مو سطوح فائم مجب شوند	۱۴۴۳۳۹۵
۷۲	ابهیه	مشینیت خاکی با ماسنین	۰۲۰۱۰۲	خاکبریده زی، با همودر، طواری در رسمهای ساخت و اهر اوسیله مکانیکی، حداکثر، داخلی، خارجی، خاکبریداری نا افلاط ۲۰ متر از مرکز غلیل برآشته و بود، تردن آن	۳۱۴۱۴۷
۷۳	رف، راه آهن و باند فریده	کلرسی فولادی با میکرتو	۰۶۰۶۰۹	تیهی، بردس، حمه کردن و کار گذاشتن میله کرده اجبار از نوع AIII به قدر تا ۱۰ میلیمتر برآوردن ملیع با سیمه پیچی لازم	۰۶۳۳۴۴
۷۴	ابهیه	عملیت خاکی با ماسنین	۰۲۰۱۰۱	شکر زدن هر نوع رسن خبرسکری با وسیله مکانیکی، حقیقی ۱۵ سانتیمتر	۱۷۸۴۶۱۸
۷۵	ابهیه	حمل و نقل	۰۳۰۱۰۲	حمل، حمل الات و سمنز پر کشو، تسبیب به ماز، رز ۱۵ کیلومتر تا فاصله ۰ - ۳ کیلومتر	۱۶۰۱۳۶۴
۷۶	ابهیه	ردگ امیری	۰۲۰۰۳۰	بهیهه مصالح و اجرای رنگ، اینکسی ملی آمده دو جزوی ۱۷۰۱۰۸۵۶ به طبقی مذکور همو روزی مکانیکی، خودکشی میگردند، می خواسته تراویح خود را در میگذارند	۰۶۰۰۰۰
۷۷	ابهیه	کارخانی فولادی با	۰۲۰۰۰۲	بهیهه و هضب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود	۱۳۶۹۰۴۷
۷۸	ابهیه	عملیات تخریب	۰۲۰۰۰۲	بر جوش (تخریب)، جذوی های بتنی پیش ساخت	۱۰۵۲۲۲۰
۷۹	ابهیه	ابدودگری و بندگشی	۰۲۰۰۰۷	هد و مسافری، مانعه ملکه صیمن ۱۵ به خدمت از جویه رنگ، سلتیمیر، روی سطوح افقی	۱۳۸۵۰۵۸
۸۰	ابهیه	ابدودگری و بندگشی	۰۲۰۰۰۶	تیهی ملایی، دو زمینی کشته (قطر روبه) روی سطوح فاقد و افقی به ضخامت ۱ متر ۰.۵ متری متر با ملات هوازیک ۰.۵ و شمعه دگری شونده ای با عرضه محدوده ۰ متری متری و شعاعی ۰.۱	۱۷۷۴۰۸۴۵
۸۱	ابهیه	عمیمات تخریب	۰۱۰۰۰۳	تخریب اعمال بین دو خط برش (ما فاصله) جداگانه هم ۰.۱ متر با وسیله مکانیکی مذکور که بر جویه را بدل سکانی کو، پهضایی ۰.۷ و نیسترن و برد مذکور آن	۰۸۳۰۵۷
۸۲	ابهیه	حمل و نقل	۰۲۰۰۰۲	حمل، اهن الات و سیمان پاکشی، نسبت به مزاد بر ۰.۲ کیلومتر تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر	۰۹۷۰۷۷۶
۸۳	ابهیه	حمل و نقل	۰۲۰۰۰۵	حمل، اهن الات و سیمان پاکشی، نسبت به مزاد بر ۰.۴۵ کیلومتر تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر	۰۷۷۰۷۲۸

نوغیر: پهای واحد دیفها با حساب خرابی شهروند پهای جوز خرب، بالا سری و خیزمه مجهز و برسانن کارگاه می باشد

مهر و امنیتی مهندس مشور

جدول ۱. دیدهای مورد استفاده در نظرسنجی یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردهایها

کد پروژه: ۰۰۷

نام دستگاه اجرایی: مجتمعه فنی باراجین

۱

تاریخ: ۹۸/۰۶/۱۵

نام مهندس مشاور: آرمان‌مهر عینو

کد و عنوان طرح:

ساخته دیال

شماره	فهرست بهای رشتہ	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح مختصر ردیف	بهای کل ردیف
۱۶	پنجه	رنگ آمیزی	۲۵۰۱۰۱	لاده‌ای، با زنگ زدایی اسکلت‌های مولادی ۴ سباده با مر من صیغه	۱۰۵۹۸۵

توضیح: بهای واحد ردیفها با اختصارهای هراید آجر...، دی، بجز ضریب، الاء...، دی، بجز ضریب، الاء... و هزینه سهیز و برجستن گارگاه می باشد

مهر و امنی مهندس مدلور

مهندسی بیمانکار

جدول ۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۷۰٪ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند

تاریخ: ۱۳/۰۴/۲۰۲۰

نام دستگاه احتمالی: مجموعه فنی راهجین

موضع عارضه سایت لایک سیفی و این

تاریخ: ۱۸/۴/۲۰۱۵

فناه مرغندس، مشاور: دکانشیر مینو

گد و عنوان طنز

مسالغ و مال

توضیح: همچنانکه در فایل این مقاله قید سنت بجا داشتند که قید بمالکیت و معاشره تحریم شود، لذا کارهای مبادله

١٥٦

جدول ۲. ردیفهایی که در سخنوار حایه حداقل ۸۰٪ عرصه سلیقه برآورده‌زینه گل تکار هستند

کد جزو ۱۰

تاریخ: ۲۰۱۹/۰۷/۰۵

نام و ممتلكات احوالی مجموعه فیض‌الحمد

مذکووه کی : دوڑھ صائب بارگ مسیع نامہ جن

یام ہبندیوں سے اور: اصل پر عین

کد و عنوان مترجم:

164

ردیف	عنوان فصل	شماره فصل	شماره قسم	شرح زیردست	واحد	بهای واحد	سینار	بهای کل و دست
۱۵	بتن پیش ساخته و بلوك	۱۶	۱۱	تپیده و نصب جنگل های پرسی... آنکه در اینجا سطح مقطع بیش از ۲۶ - مترمربع و در حداقل مقاومت سازه ای استاندارد ۲۸- کلکو گرم بر سانتی متر مربع	مترا مکعب	۰.۰۵-۰.۰۷	۱۶۳۵۰	۷۸۹۸۴۹۹۶
۱۶	بتن پیش ساخته و بلوك	۱۷	۱۲	دهمه، ساخت و حضور قطعه های پیش ساخته (pipe) ساخته برای حکیم گاه لوبه و گرهاش مشابه، با عمر ۳۰۰ کیلو گرم سینه در سر مکعب بتن	مترا مکعب	۰.۰۵-۰.۰۷	۱۶۰۰۰	۴۴۵۱۷۸۱۶۶
۱۷	بتن پیش ساخته و بلوك	۱۸	۱۳	نهمه، مصالح، حمل و اجرای آنبوسان های پیش ساخته ساخته پرسی، به مطابقت با ساندویچ مترو به سطح تا ۱۶ مترمربع برای هر کنیوپس، با هر نوع ملات مذکوره از پردازش	مترا مربع	۰.۰۴-۰.۰۷	۱۶۰۰۰	۷۰۰۳۱۳۸۱۹۰
۱۸	بلدوگوز و پلاکتی	۱۹	۱۴	لدود سینه، بالاتر ماسه سینه ۱۵-۰.۰۶ مترمربع هدود ۲ سانتی متر، برای مصالح انتقال	مترا مربع	۰.۱۵-۰.۲	۱۶۰۰۰	۴۴۷۷۱۱۱۹۵
۱۹	فرش موzaپیک و کپروپوش پیش	۲۰	۱۵	نهمه، مصالح، حمل و اجرای کنیوپس های پیش ساخته ساخته پرسی، به مطابقت با ساندویچ مترو به سطح تا ۱۶ مترمربع برای هر کنیوپس ماک ۲ سینه سر ماسه ثوم ریز آن و دوغاب زیری	مترا مربع	۰.۰۵-۰.۰۷	۱۶۰۰۰	۴۴۸۱۳۸۱۸۸
۲۰	فرش موzaپیک و کپروپوش پیش	۲۱	۱۶	نهمه، اجرای کپروپوش گرانولی عدسیلی ناچمه، مخصوص	مترا مربع	۰.۰۵-۰.۰۷	۱۶۰۰۰	۴۴۸۱۳۸۱۸۸
۲۱	گلزاری مدنگی پلاستیک پلاک	۲۲	۱۷	نهمه، پلیمر، سینگ، پلاک، هربرت، گلزاری دو شش ای به ساخته ۲ سانیتمتر در سطوح انتقال	مترا مربع	۰.۰۳-۰.۰۷	۱۶۰۰۰	۴۴۸۱۳۸۱۸۸
۲۲	زیرباسی و لاین	۲۳	۱۸	نهمه، مصالح اصلی / مصالح روکخانه ای - آلهه، زیزی، منظر تا ۱۶ مترمربع، وقی که در اقل ۰.۵ رده، مصالح شده درون آن، نمایه ۰.۵ در زیر، و زیر ۰.۵ در روکخانه	مترا مکعب	۰.۰۵-۰.۰۷	۱۶۰۰۰	۴۰۰۱۶۹۳۱۷۰
۲۳	زیرباسی و لاین	۲۴	۱۹	نهمه، مصالح اصلی / مصالح روکخانه ای - سکب ستر راه و محوكه، با اسرائیل خشم، تقویتی در زیر سازه را و محدوده	مترا مکعب	۰.۰۵-۰.۰۷	۱۶۰۰۰	۴۴۱۴۴۳۳۸۷۱
۲۴	جمع روشه برآورد	۲۵	۲۰	جمع			۱۶۰۰۰	۴۴۱۴۴۳۳۸۷۱
۲۵	جمع کل برآورد	۲۶	۲۱	جمع			۱۶۰۰۰	۴۴۱۴۴۳۳۸۷۱

نحوی پیغام را در دیدنی با انتصب غرایب غیرسب پیدا می‌نماید. همچوین غرایب می‌الاسوی و همچوین تجهیزی و در حذفین کارکله مسلط

مهر و امضای بیانکار

میر و ملکاںی صنعتیں، مشاہد

جدول شماره ۲، مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر قسم

فهرست بهای واحد بات رسمی اینیه سال ۹۸

کد پروژه: ۷۰۰

نام دستگاه اجرایی: مجموعه فنی پاراجین

موضوع کار: پروژه ساخت پارک مسافر ناراس

تاریخ: ۹۸/۴/۱۵

نام مهندس مشاور: آرامشهر مینو

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ريال

ردیف	ردیف	عنوان حصل	ردیف	ردیف	برآورد حصل						
					ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف
ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف
۱	۱	عملیات تحریب	۱	۱	۵۷۶۳۶۶۹۷	۵۷۶۳۶۶۹۷	۵۷۶۳۶۶۹۷	۵۷۶۳۶۶۹۷	۵۷۶۳۶۶۹۷	۵۷۶۳۶۶۹۷	۵۷۶۳۶۶۹۷
۲	۲	عملیات خاکی با اندس	۲	۲	۴۱۸۵۲۵۲۶۵	۴۱۸۵۲۵۲۶۵	۴۱۸۵۲۵۲۶۵	۴۱۸۵۲۵۲۶۵	۴۱۸۵۲۵۲۶۵	۴۱۸۵۲۵۲۶۵	۴۱۸۵۲۵۲۶۵
۳	۳	عملیات پلی با استک	۳	۳	۳۷۵۷۳۷۷۷۷	۳۷۵۷۳۷۷۷۷	۳۷۵۷۳۷۷۷۷	۳۷۵۷۳۷۷۷۷	۳۷۵۷۳۷۷۷۷	۳۷۵۷۳۷۷۷۷	۳۷۵۷۳۷۷۷۷
۴	۴	غلاب بندی فولادی	۴	۴	۱۵۱۲۱۲۶۹۵	۱۵۱۲۱۲۶۹۵	۱۵۱۲۱۲۶۹۵	۱۵۱۲۱۲۶۹۵	۱۵۱۲۱۲۶۹۵	۱۵۱۲۱۲۶۹۵	۱۵۱۲۱۲۶۹۵
۵	۵	کارهای فولادی با امپلکرد	۵	۵	۴۷۷۲۰۱۶۷	۴۷۷۲۰۱۶۷	۴۷۷۲۰۱۶۷	۴۷۷۲۰۱۶۷	۴۷۷۲۰۱۶۷	۴۷۷۲۰۱۶۷	۴۷۷۲۰۱۶۷
۶	۶	بنچ غرجا	۶	۶	۴۸۵۱۲۴۱۸	۴۸۵۱۲۴۱۸	۴۸۵۱۲۴۱۸	۴۸۵۱۲۴۱۸	۴۸۵۱۲۴۱۸	۴۸۵۱۲۴۱۸	۴۸۵۱۲۴۱۸
۷	۷	کارهای فولادی منگیر	۷	۷	۶۷۱۴۴۴۶	۶۷۱۴۴۴۶	۶۷۱۴۴۴۶	۶۷۱۴۴۴۶	۶۷۱۴۴۴۶	۶۷۱۴۴۴۶	۶۷۱۴۴۴۶
۸	۸	آجر کاری و دخنه رازی	۸	۸	۲۷۵۳۸۷۵۶	۲۷۵۳۸۷۵۶	۲۷۵۳۸۷۵۶	۲۷۵۳۸۷۵۶	۲۷۵۳۸۷۵۶	۲۷۵۳۸۷۵۶	۲۷۵۳۸۷۵۶
۹	۹	پیش ساخته و بلوك چیز	۹	۹	۵۷۷۳۲۱۹۸۵	۵۷۷۳۲۱۹۸۵	۵۷۷۳۲۱۹۸۵	۵۷۷۳۲۱۹۸۵	۵۷۷۳۲۱۹۸۵	۵۷۷۳۲۱۹۸۵	۵۷۷۳۲۱۹۸۵
۱۰	۱۰	اعماق گاری و طوبی	۱۰	۱۰	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷
۱۱	۱۱	گردهای فولادی سبک	۱۱	۱۱	۶۱۱۱۱۱۹۹۱	۶۱۱۱۱۱۹۹۱	۶۱۱۱۱۱۹۹۱	۶۱۱۱۱۱۹۹۱	۶۱۱۱۱۱۹۹۱	۶۱۱۱۱۱۹۹۱	۶۱۱۱۱۱۹۹۱
۱۲	۱۲	اندودکاری و پیشکشی	۱۲	۱۲	۱۶۱۲۲۷۷۶	۱۶۱۲۲۷۷۶	۱۶۱۲۲۷۷۶	۱۶۱۲۲۷۷۶	۱۶۱۲۲۷۷۶	۱۶۱۲۲۷۷۶	۱۶۱۲۲۷۷۶
۱۳	۱۳	قوش موزاییک و کعبوشن مشی	۱۳	۱۳	۸۸۶۲۱۱۶۲۳	۸۸۶۲۱۱۶۲۳	۸۸۶۲۱۱۶۲۳	۸۸۶۲۱۱۶۲۳	۸۸۶۲۱۱۶۲۳	۸۸۶۲۱۱۶۲۳	۸۸۶۲۱۱۶۲۳
۱۴	۱۴	گارهای سنتی با استک پلاس	۱۴	۱۴	۷۷۶۲۱۱۶۲۳	۷۷۶۲۱۱۶۲۳	۷۷۶۲۱۱۶۲۳	۷۷۶۲۱۱۶۲۳	۷۷۶۲۱۱۶۲۳	۷۷۶۲۱۱۶۲۳	۷۷۶۲۱۱۶۲۳
۱۵	۱۵	گردهای پلاستیکی و پلیمر	۱۵	۱۵	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷
۱۶	۱۶	ریگ اسیزی	۱۶	۱۶	۲۱۱۲۱۱۶۲۳	۲۱۱۲۱۱۶۲۳	۲۱۱۲۱۱۶۲۳	۲۱۱۲۱۱۶۲۳	۲۱۱۲۱۱۶۲۳	۲۱۱۲۱۱۶۲۳	۲۱۱۲۱۱۶۲۳
۱۷	۱۷	زیراساس و اساس	۱۷	۱۷	۱۶۱۲۲۷۷۶	۱۶۱۲۲۷۷۶	۱۶۱۲۲۷۷۶	۱۶۱۲۲۷۷۶	۱۶۱۲۲۷۷۶	۱۶۱۲۲۷۷۶	۱۶۱۲۲۷۷۶
۱۸	۱۸	حمل و عقل	۱۸	۱۸	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷	۱۷۱۲۱۷۷
۱۹	۱۹	جمع کل	۱۹	۱۹	۵۷۶۳۶۶۹۷	۵۷۶۳۶۶۹۷	۵۷۶۳۶۶۹۷	۵۷۶۳۶۶۹۷	۵۷۶۳۶۶۹۷	۵۷۶۳۶۶۹۷	۵۷۶۳۶۶۹۷

نوصیح: بهای واحد درینها با محاسبه ضرائب فدریست بهدین صریب بالا رفت و هزایه تاخیز و برجستگی کرده می باشد.

میر و مشایع مهندس مشاور

جدول شماره ۲. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورده بر حسب هر فصل

$$\langle \Phi \rangle$$

^{۹۸} فهرست یهای واحد چایه و شته راه، راه آهن و پاند هرودگاه سال

۷ - پروژه

نام دستگاه اجرایی: مخصوصه فنی، با این

1

موضوع کار: پروژه سایت راگز، هسته راندوز

387-1718 : 80 U

نام سلندس، سهام

گل و عسلان طرح:

مالیہ

توضیح: پدی و احمد و زینبها با انتساب شرایط فیزیکی های بین: این بیب پلاسما و همراه آنها در جهش کرکه می باشد

جذب انتقام

REFERENCES AND NOTES

جدول ۴ . مقایسه مبلغ پیشنهادی بینکار با مبلغ برآورد

بر حسب هر و شنیده ئ کل کار

کد یروزه : ۰۷

نام دستگاه اجرایی : مجموع فنی پارچمن

موضوع کار : بروزه سایت پارک مسافر اراجین

تاریخ : ۹۸/۰۴/۱۵

نام سهندس مشاور : آناتور مهر

کد و عنوان طرح :

بالغ هر ریل

شماره	رشته	جمع فصلها	درصد نسبت به برآورد کل	درصد نسبت به پیشنهادی پیمانکار	افتاده	تفصیل
۱	ابنیه	۶۸/۳۳	۰۶۱،۱۷۹۳۵۶	۰۷۰،۰۷۳		پیشنهادی
۲	راه، راه اهن و باند فروشگاه	۰/۱۰	۸۱۱۷۰۴۴	۰/۰۷		پیشنهادی
	هزینه بالاسری	۲۸/۱۸	۰۷۰،۰۷۳۷۵۳	۰۷۰،۰۷۳		پیشنهادی
	هزینه تجهیز و برجیشن کارگاه	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰		پیشنهادی
	جمع (برآورد کل)	۱۰۰	۰۷۰،۰۷۳۷۵۳	۰۷۰،۰۷۳		پیشنهادی

توضیح: بیانی واحد ریفها به اختساب ضرائب دھرس پها مجر ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برجیشن کارگاه دی باشد.

میر و امضای مومندن مشور

برآورد و امضای پیمانکار

V.A

«جدول ۵. تجزیه بهای اقلام کار»

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
کد مدرک:

نام پژوهش:
کد پژوهش:
نام دستگاه اجرایی:
نام مهندس مشاور:
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
کد و عنوان طرح:

مثال برای:

				مقنن:		واحد:		مشعاره ردیف آنالیز:	
				مقنن:		واحد:		ردیف کد عامل:	
k^*	بهای کل *	k	بهای واحد	بهای کل	مقدار مقیاس	مقیاس	واحد		
	:		:						

توضیح:

		توضیح:		جمعیت بهای واحد ردیف یا ردیفهای معادل:	
-	مقایسه پیشنهاد				
-	نسبت به برآورد (۰,۰۰)				

بهای واحد نزولی:

بهای کل نزولی:

۱- بونویج مقیاس: حجم عملیات در نظر گرفته شده، برای تابعیتمندی کر و بینه. ها

۲- توصیح مشین آلات، مدت زمان و سطر گرفته شده برای کارگر، ملاشی آلات در مقاله و توقیع، از میان زمان، کار (۰,۰۰) زمان، کار کرد بعد از شود.

میز و اتصال پیمانکار

جدول ۶ - تجزیه بهای هرینه بالاسری

(۱)

کد سفارش:

نام پروژه:

تاریخ:

نام دستگاه اجرایی:

نام هندس مشاور:


نام پروژه:

نام پیمانگار:

ردیف	بخش های مختلف هرینه بالاسری	درصد
P ₀	جمع	

$$= \frac{P_0}{100 + (100 - P_0)}$$

میر؛ اضای پیمانگار

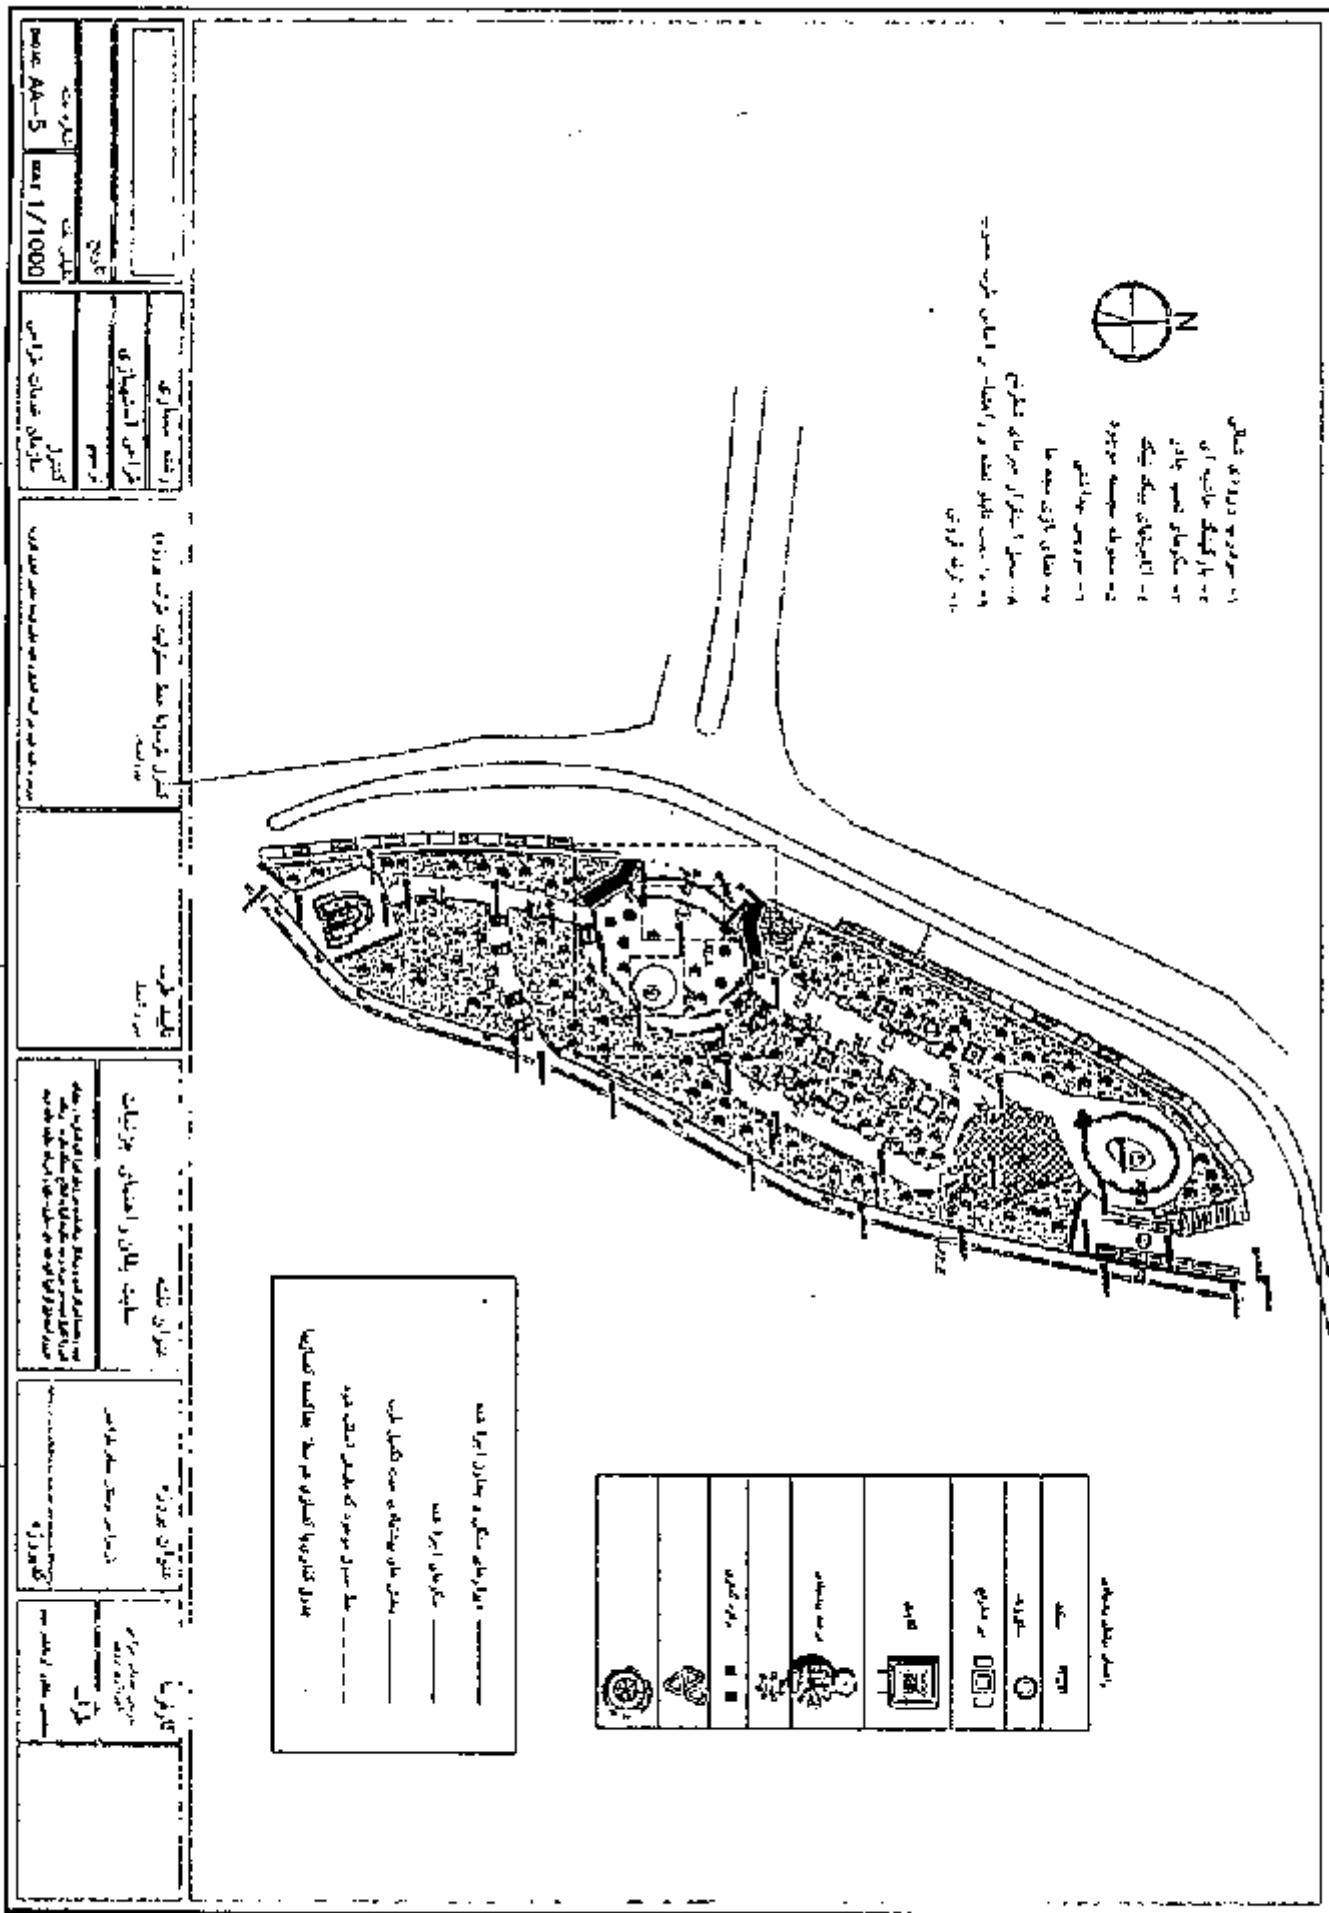

دربیش پنیس از پون با عیار ۳۰۰ گیلوگرم در منظر مکعب


به قدر ۱۱۰ سانتی متر

با بند گنس از ملات ماسه سینهان به صادر ۲۰۱

دربیش پنیس از پون با عیار ۳۰۰ گیلوگرم در منظر مکعب
به قدر ۱۱۰ سانتی متر
با بند گنس از ملات ماسه سینهان به صادر ۲۰۱



با مغارت مشتمل ۱۱ میلیمتر

کفازی سطحی طرب
ملات ماسه بیان ۵۵
لایه پیش با اکم ۹۶
بند رویانه ای کریده با اکم ۹۵

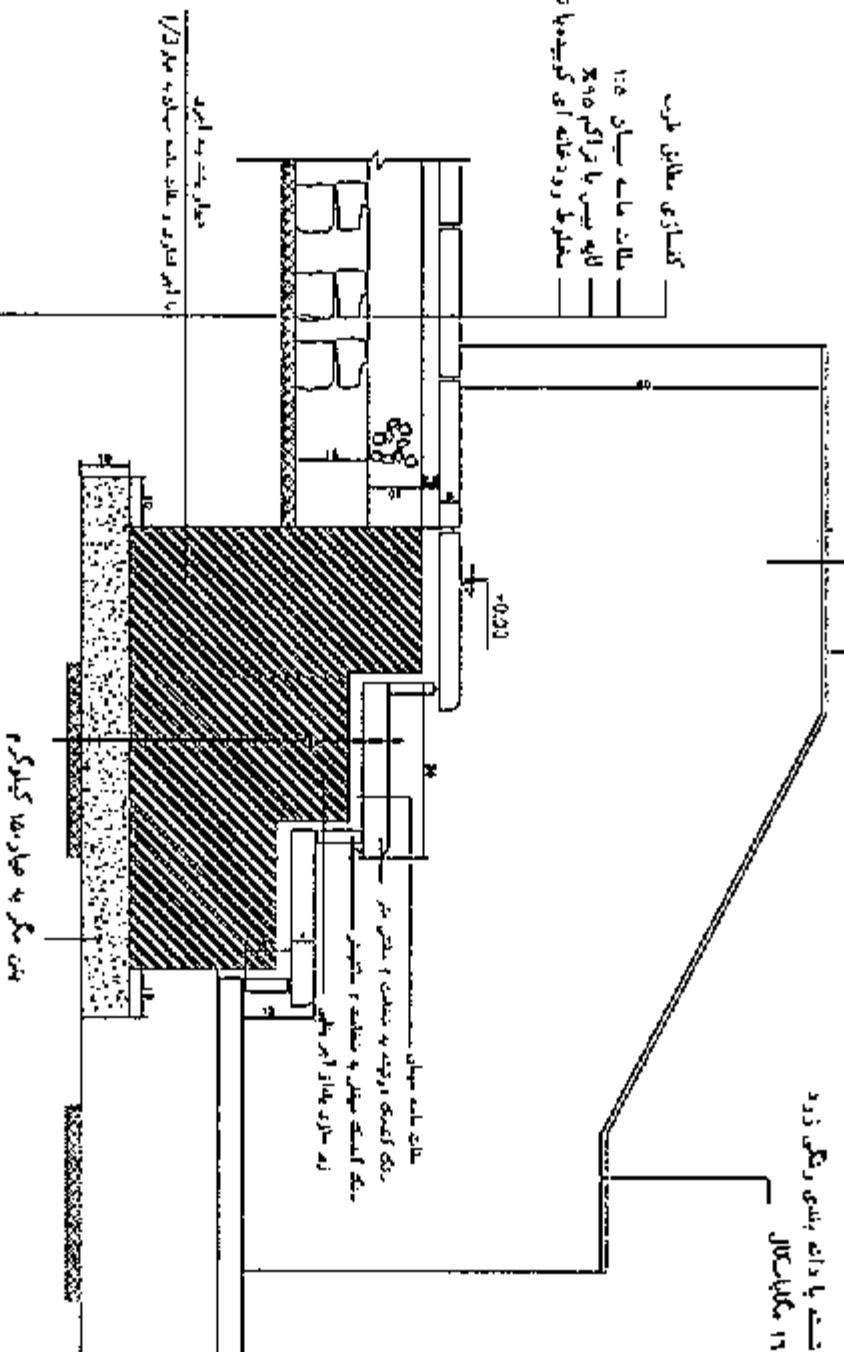

خاک طبیعی کریده با اکم ۹۵ درصد
به روش به مادرها کلوروم

کارخانه مشهد مقدس	خران موزه	خوارج	دروازه	DP-D
آذوقه	آذوقه	آذوقه	آذوقه	آذوقه
کارخانه مشهد مقدس	خران موزه	خوارج	دروازه	DP-D
آذوقه	آذوقه	آذوقه	آذوقه	آذوقه
کارخانه مشهد مقدس	خران موزه	خوارج	دروازه	DP-D

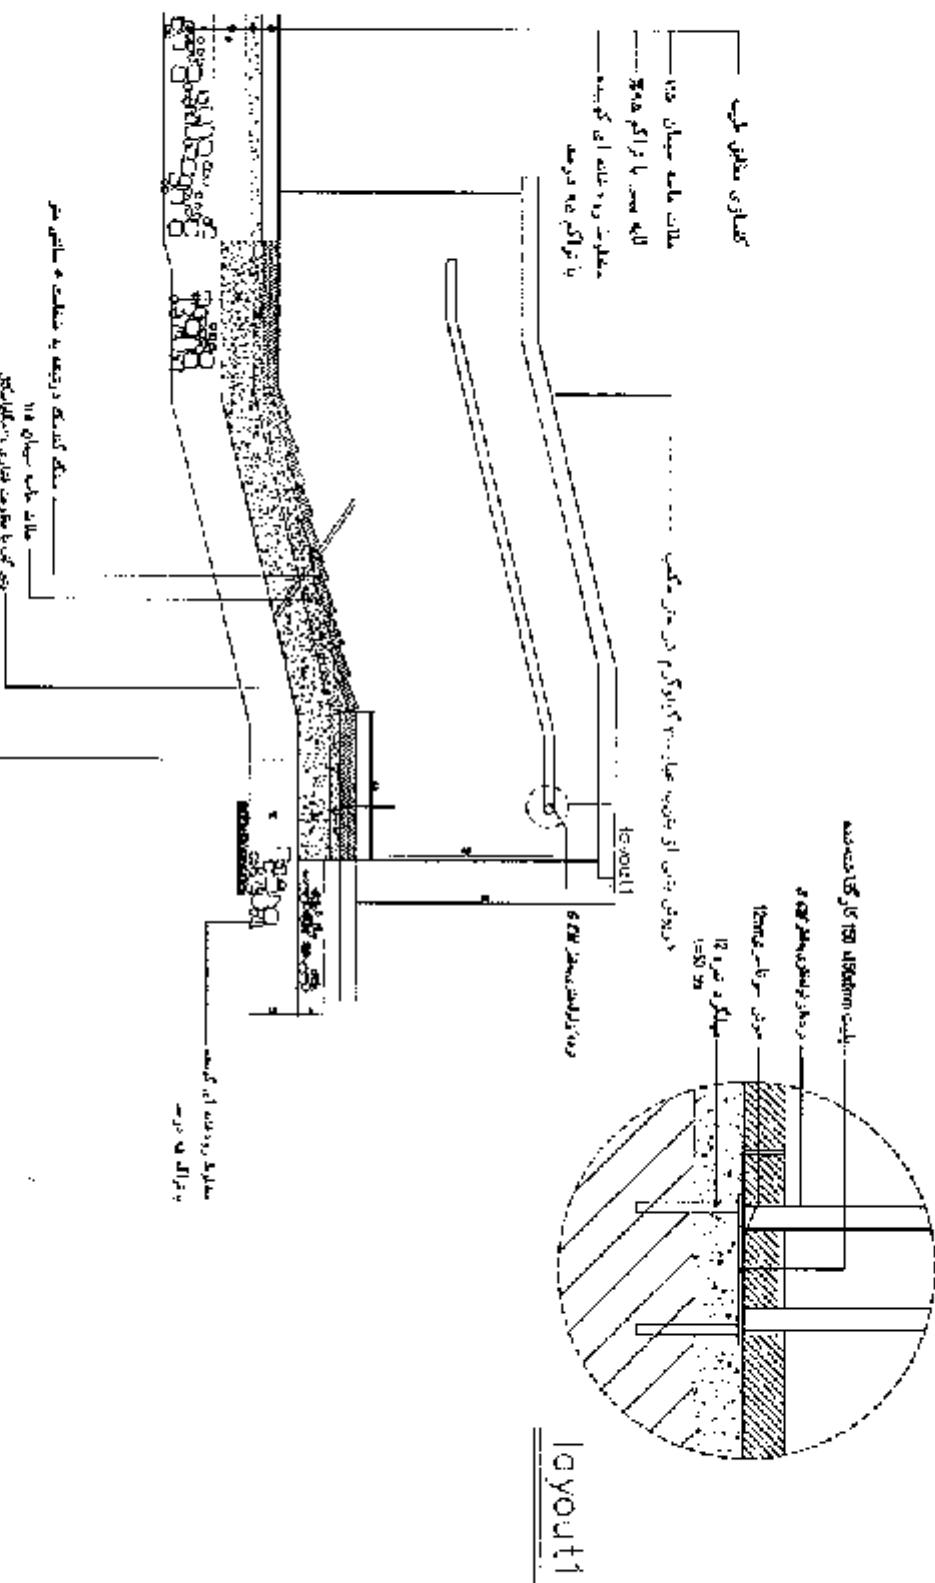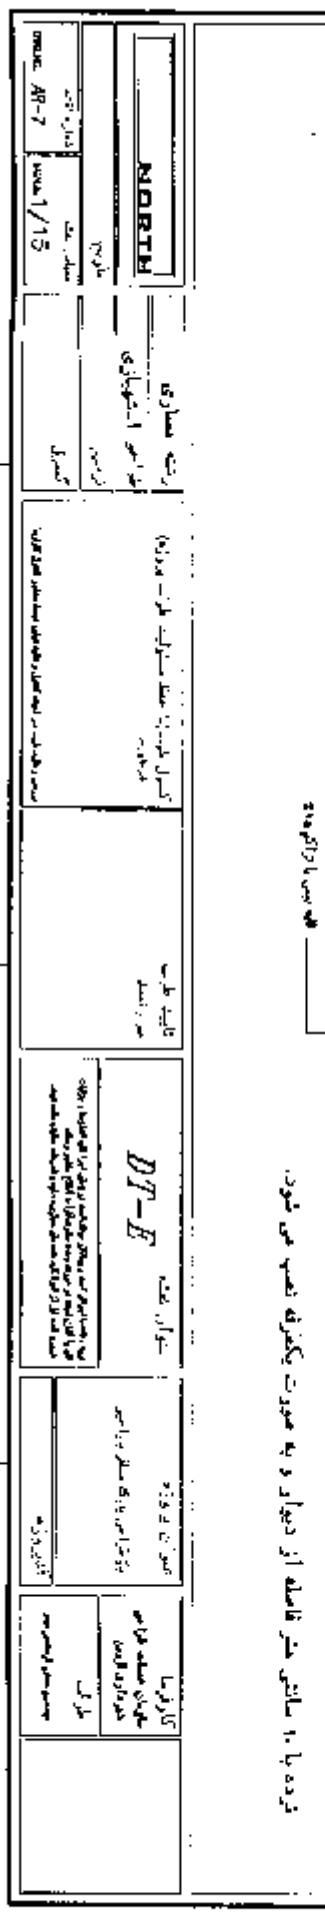


سیاست کنندگان در پیشنهادهای ملک

四百

185


卷之三

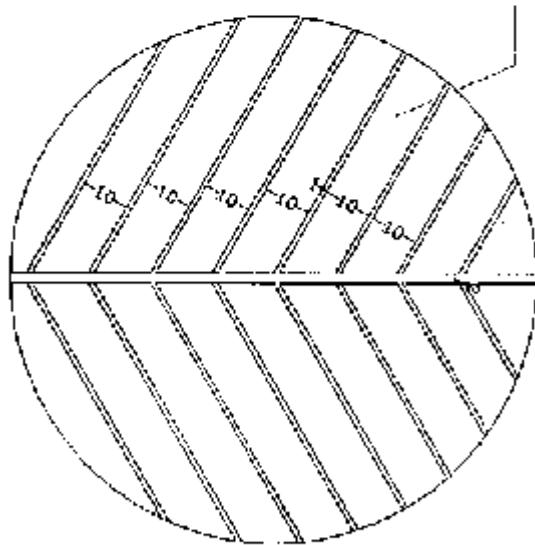


۱۰۷

مکالمہ علیہ شریف

بستر متر آنک شده

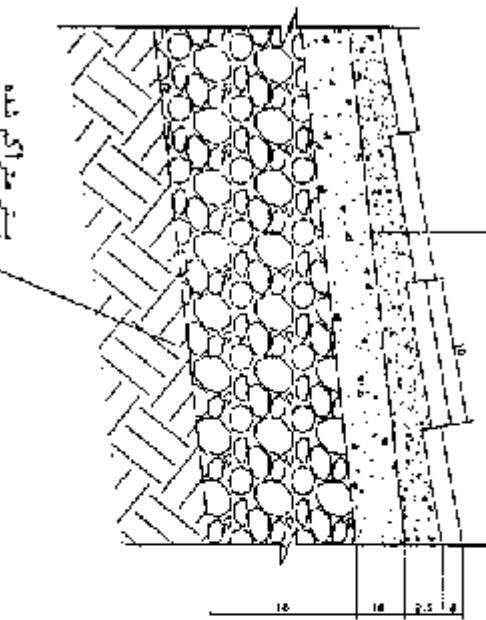

گروپ ۱	گروپ ۲	گروپ ۳
کنترل	کنترل	کنترل

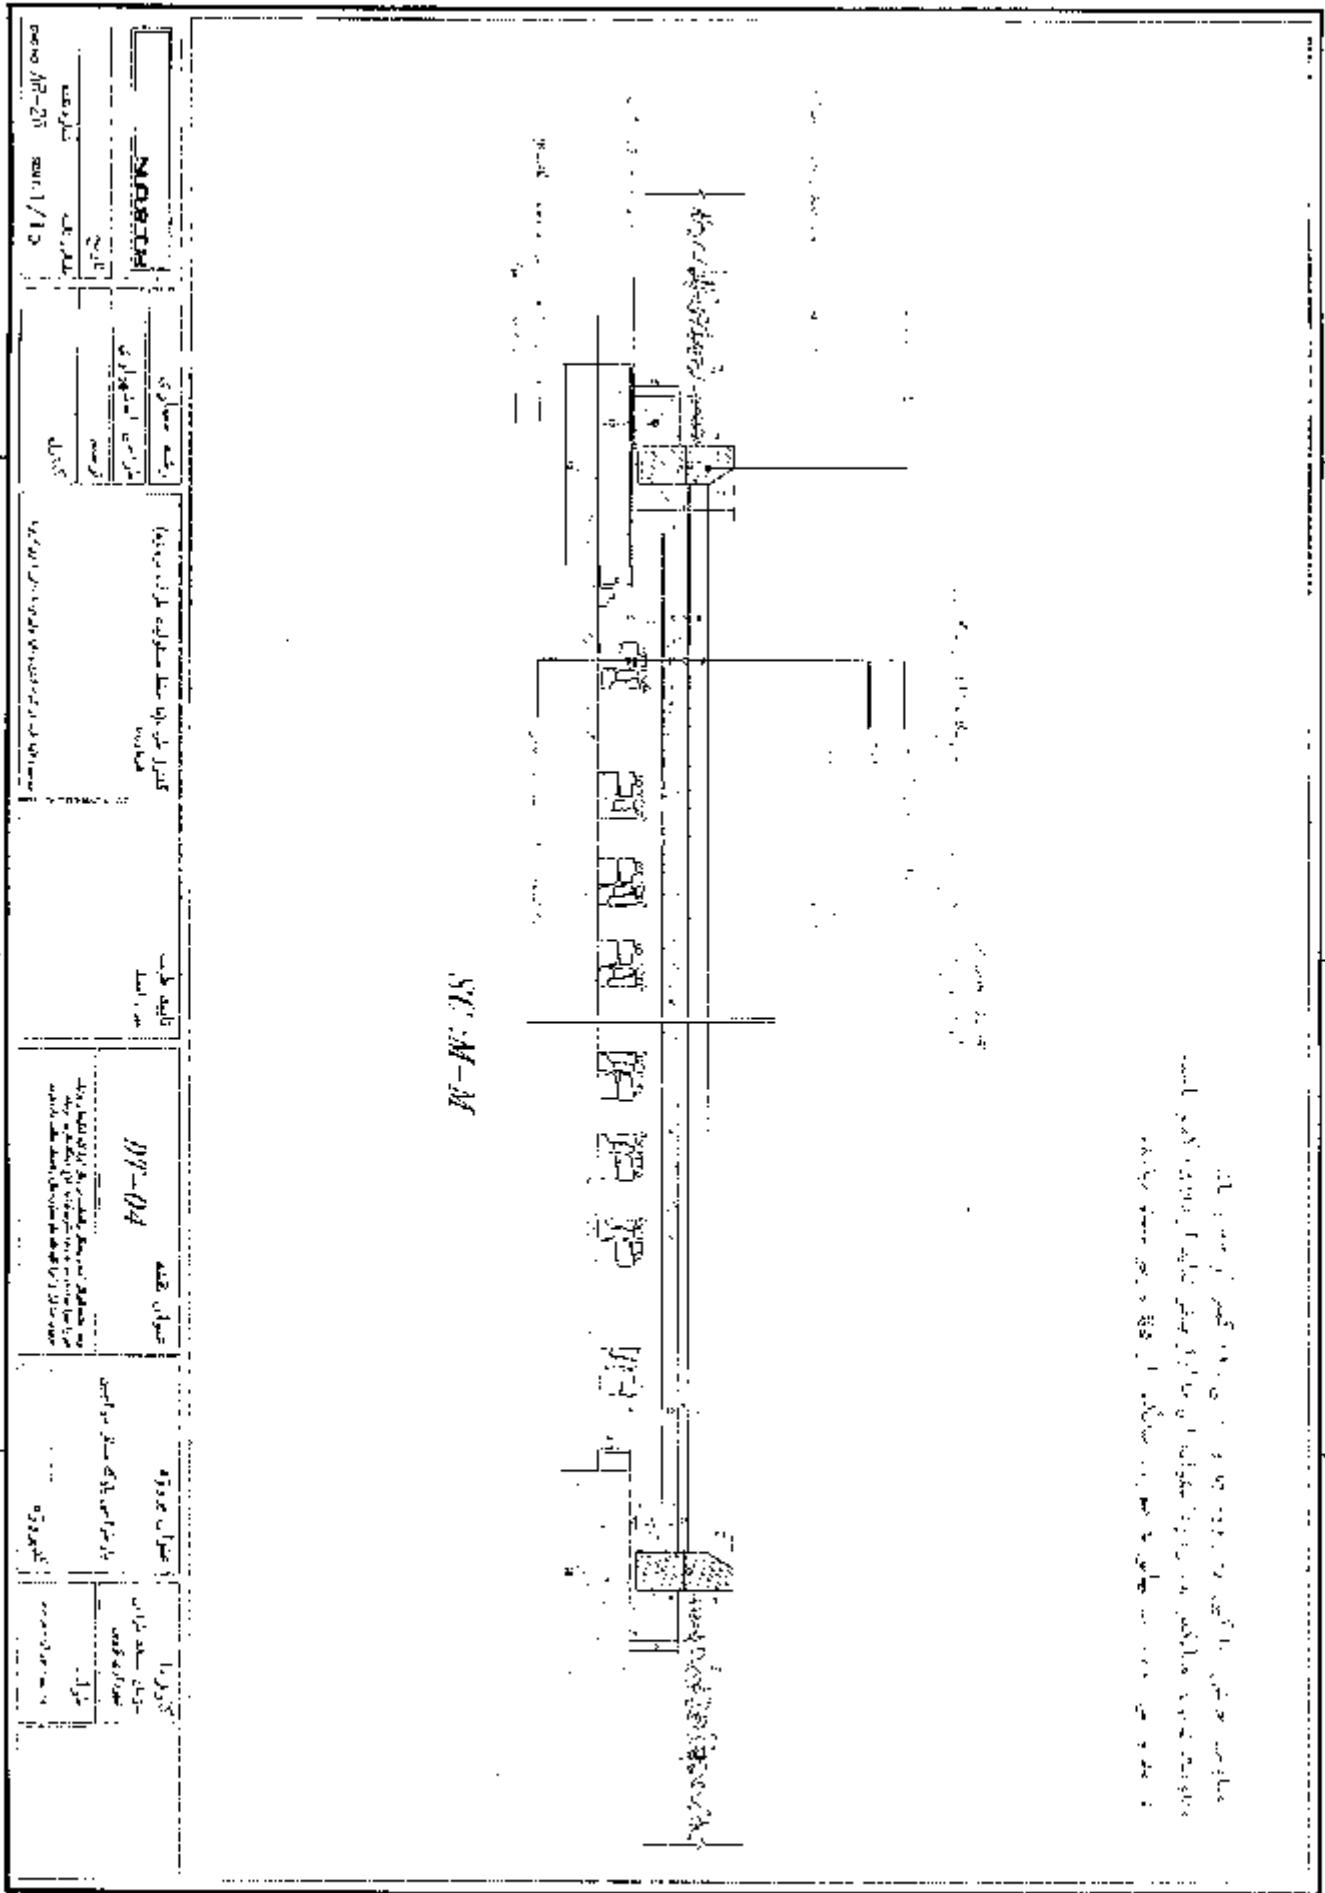

1

کنترلر ایجاد کننده	کنترلر ایجاد کننده	کنترلر ایجاد کننده
کنترلر ایجاد کننده	کنترلر ایجاد کننده	کنترلر ایجاد کننده
کنترلر ایجاد کننده	کنترلر ایجاد کننده	کنترلر ایجاد کننده
کنترلر ایجاد کننده	کنترلر ایجاد کننده	کنترلر ایجاد کننده
کنترلر ایجاد کننده	کنترلر ایجاد کننده	کنترلر ایجاد کننده



DT-C		هذا فندق	فندق سان	فندق سان
فندق سان				
فندق سان				
فندق سان				
فندق سان				

خانه خانه خانه


卷之三

卷之三

**

卷之三

卷之三

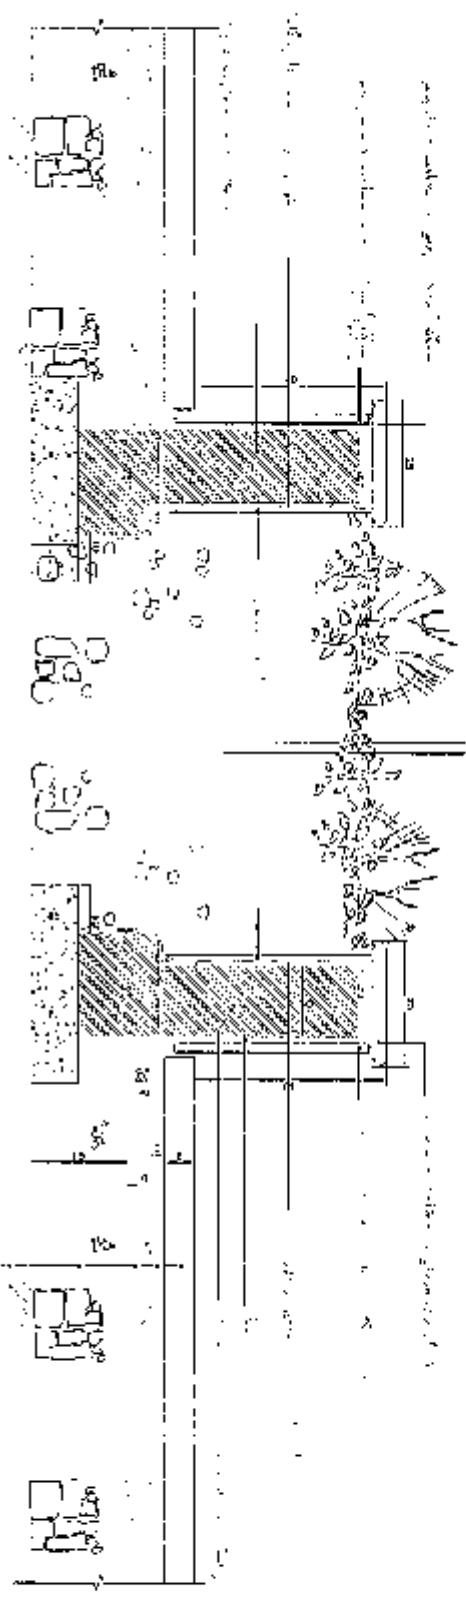

شیب نایلوو بخشش، و رنگها که بر اساس طور معمول در پلاراژ، هر دوی دست سی گزند

فرز ۱ فربادی دیا صنعتی شده به زنجیر، اینگاهی
تنهای دهن، راهنمایی، جواہر شده با دیگر نسخه
هر دوی ایندیکر و نصی این در زمینه داشتند، فربادی

لوله ایکنی (ایکن) مراد قوب تکردن سهیما داشت

+2.65

لوله ایکنی (ایکن) مراد +2.65

=0.55



Ground Level +0.00

0.50

شونج سرخ شنی پشم، ساجده
لردی وی سطیوه، بیو سرمه، چهو، زندگانی خود ریشی آصرخ، لجه شدید
من موانع ام مانیون طرح هایی مصنوعی در ریگ آصرخ، لجه شدید کرد.

نیما

در این طرس بدینی چنان فیاضت چنین حسی بودید از ای هر زوی تابعه لجه شدید انس
و چون نایمی، رو-نایمی محلیانی رسید، آنها در داخل حسومون، در تردیگی نی های زو-شتابی لحاظ نمایند انس

| نام |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| کارلی (آست-سلوپیک طواره و برو) |
| کارلی (آست-سلوپیک طواره و برو) |
| کارلی (آست-سلوپیک طواره و برو) |
| کارلی (آست-سلوپیک طواره و برو) |
| کارلی (آست-سلوپیک طواره و برو) |

卷之三

11

卷之三

— 1 —

مکالمہ

卷之三

卷之三

卷之三


卷之三

مکالمہ طہا مبارکہ اور علیہ

شامل
بازار ایرانی

14

4

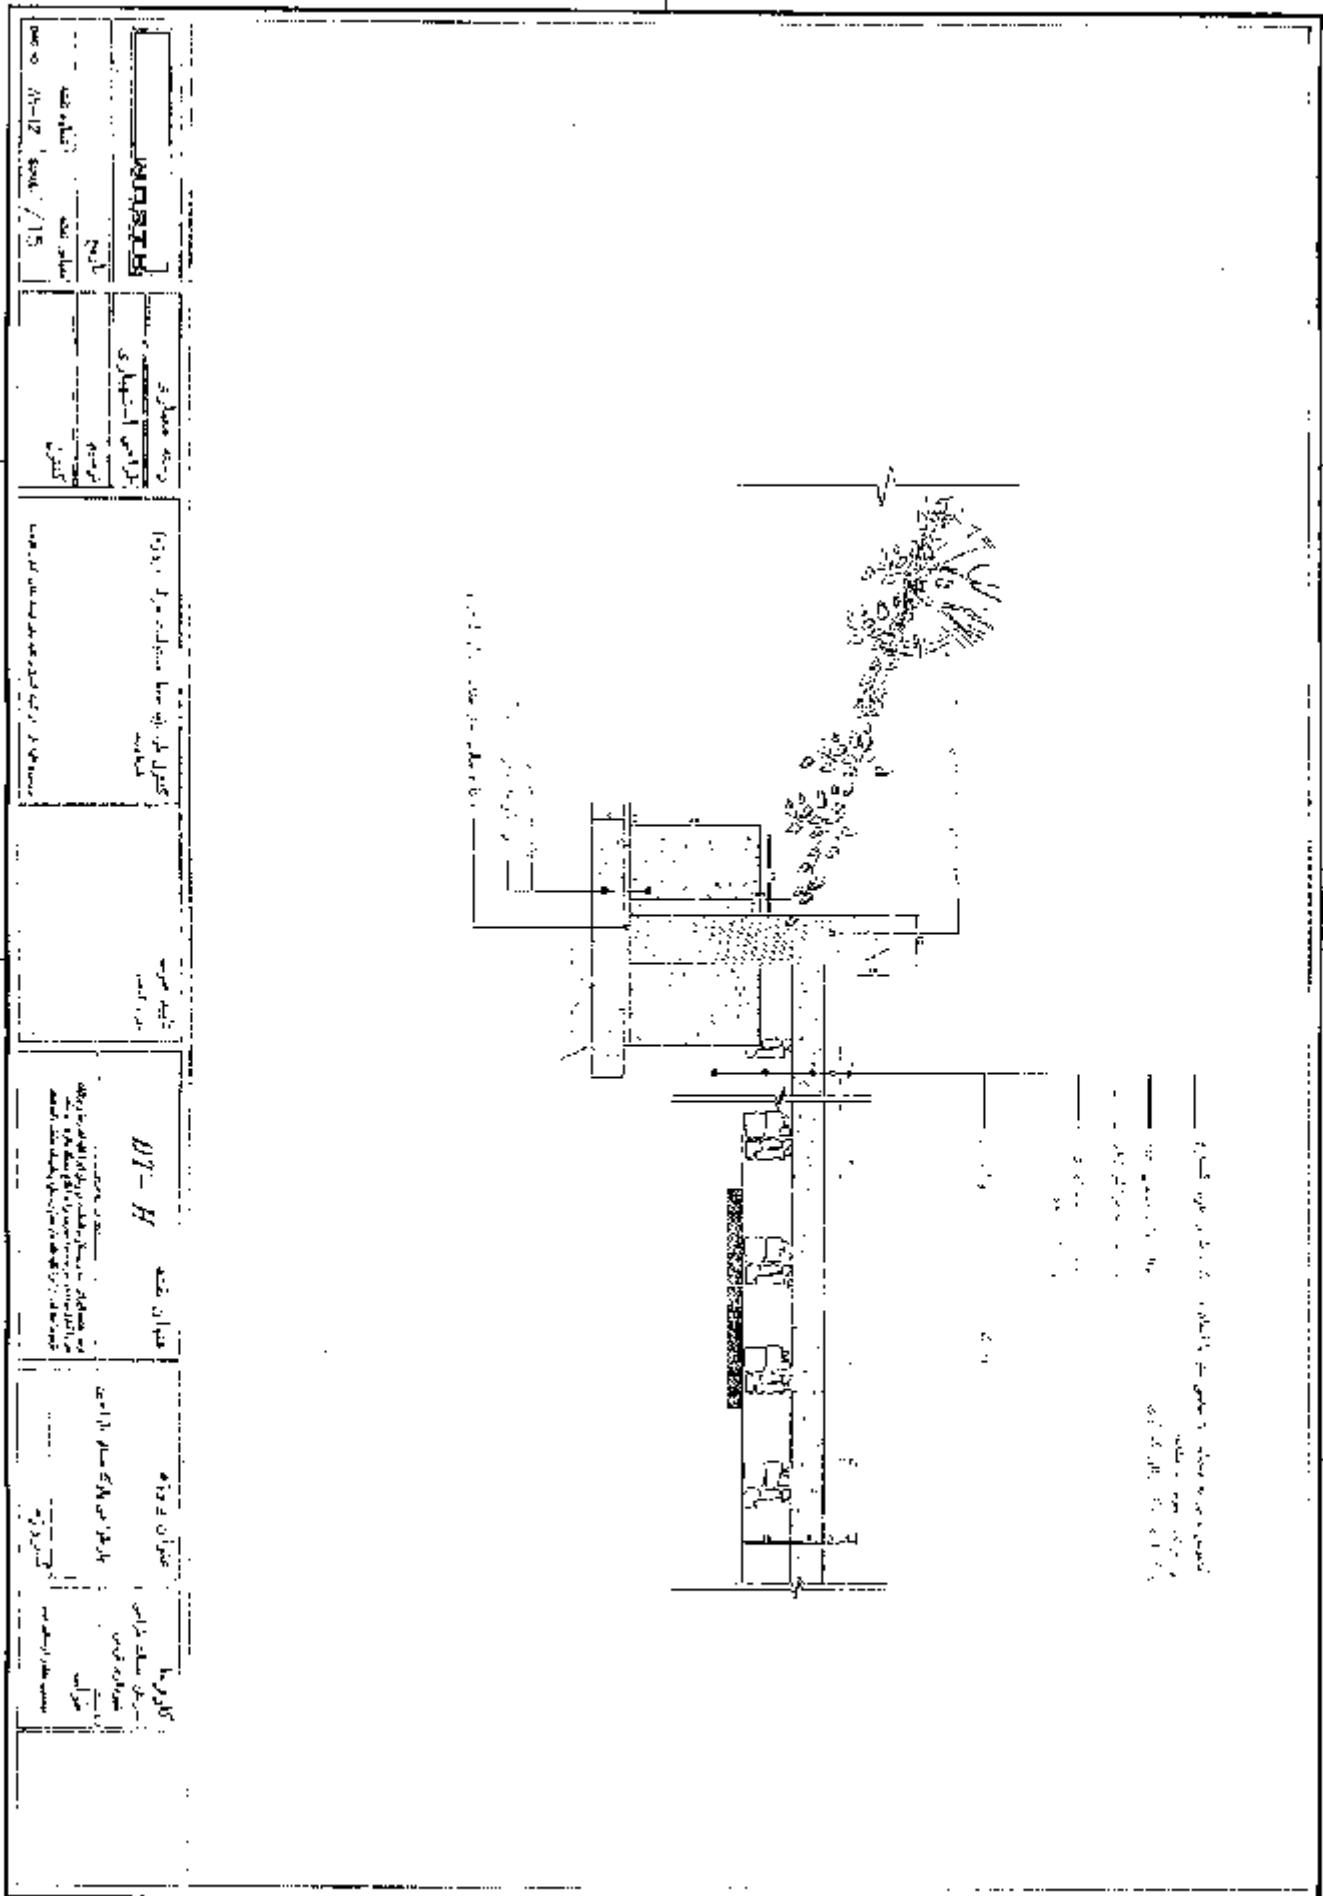

1

